

## PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

REMONT KONSERWATORSKI OKIEN WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA  
ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE



### OPRACOWANIE:


Jacek Gryczewski, dyplomowany konserwator zabytków  
ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina  
Iwona Husak, Pracownia Witraży SOL  
Rochów 8, 48-300 Nysa

Nysa, 20.11.2018

  
  
o. Mikołaj Miś  
proboszcz

## OPIS OBIEKTU

Program prac został opracowany dla trzech okien witrażowych ze wschodniej elewacji kościoła pw. Św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Autorem projektu okien jest Adam Stalony-Dobrzański.

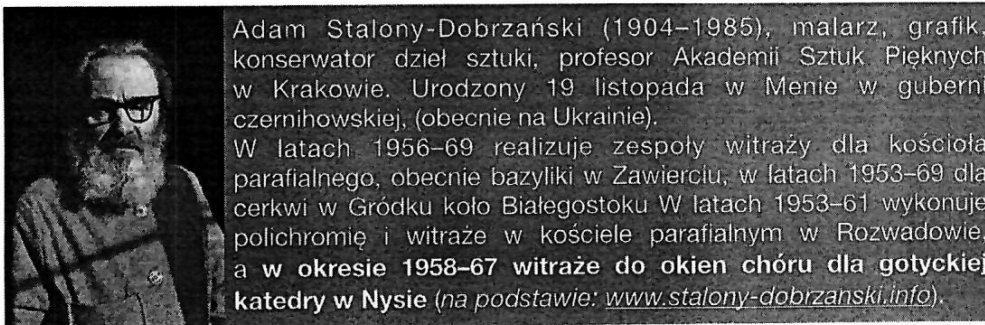

Okna powstały w latach 1958–1967. Do niniejszej dokumentacji dołączono część ze zdjęciami ukazującymi:

- położenie obiektów
- stan zachowania
- wcześniejszy wygląd okien - fotografie archiwalne
- fragmenty projektów okien

## STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Stan zachowania szkiele, elementów stalowych i kamiennych maswerków tworzących całość jest bardzo zły. Elementy kamienne nie są jednak przedmiotem obecnego opracowania.

Stwierdzono występowanie znacznych odkształceń płaszczyzn pól witrażowych spowodowane czynnikami mechanicznymi (np. naporem wiatru, być może uderzeniami ptaków).

W wielu miejscach zaobserwowano rozkruszenie miejsc lutowanych, pęknięcia taśm ołowianych oraz duże ubytki w kicie. Ponadto całość, szczególnie od strony zewnętrznej, jest pokryta brudem. Można zauważyć liczne plamy ptasich odchodów. Elementy stalowe (wiatrowniki, płaskowniki) pokryte są nawarstwieniami korozyjnymi.

W otoczeniu okien witrażowych prowadzone są prace budowlano-konserwatorskie.

## OCZEKIWANE EFEKTY PRAC

Prace planowane do wykonania poprawią estetykę szkiele poprzez usunięcie warstw brudu z powierzchni. Ponadto znacznej poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Wymiana i naprawa taśm ołowianych wzmocni kwatery, dodatkowa osłona ze szkła zabezpieczy okna przed


działaniem czynników mechanicznych. Ponadto brud nie będzie osadzać się bezpośrednio na elementach zabytkowych, co ograniczy w przyszłości korozję szkła.

#### WSKAZANIE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA (METODY, MATERIAŁY I TECHNIKI)

1. Demontaż kwater z zachowaniem należytej ostrożności, spakowanie do skrzyń, zabezpieczenie i przewiezienie do pracowni w celu wykonania prac konserwatorskich
2. Usunięcie nawarstwień korozyjnych z elementów stalowych przy pomocy metod mechanicznych (delikatnie użyta metoda strumieniowo-ścierna) oraz chemicznych (z wykorzystaniem roztworów kwasu ortofosforowego). Ewentualny demontaż elementów będzie prowadzony tylko w przypadku, kiedy czynność nie spowoduje uszkodzenia elementów kamiennych i będzie niezbędna do prawidłowego zabezpieczenia antykorozyjnego lub w celu wymiany całkowicie zniszczonych elementów.
3. Ewentualna wymiana najbardziej zniszczonych elementów stalowych na nowe, wyglądające jak detale historyczne.
4. Zabezpieczenie elementów stalowych farbą antykorozyjną z dodatkiem cynku. W razie konieczności na elementy naniesiona zostanie wcześniej tanina w roztworze alkoholowym w celu zabezpieczenia niemożliwych do usunięcia resztek nawarstwień korozyjnych.
5. Malowanie elementów stalowych na kolor grafitowy farbą matową przeznaczoną do malowania metalu.
6. Usunięcie z witrażu brudu poprzez mycie wodą i parą wodną.
7. Klejenie pękniętych szkła żywicami sztucznymi odpornymi na działanie UV.
8. Uzupełnianie ubytków szkła. Brakujące elementy zostaną zastąpione szkłem barwionym z wykorzystaniem technik umożliwiających rekonstrukcję na wzór oryginału, kierując się zasadami ciągłości kompozycji.
9. Wymiana ramek brzegowych.
10. Wymiana zniszczonych ramek ołowianych.
11. Kitowanie szkła w miejscach występowania kitów historycznych.
12. Zabezpieczenie szkła wg poniższego opisu:
  - Pakiet (oznaczenia od strony zewnętrznej do wnętrza kościoła):
  - a/ szyba bezrefleksyjna 4 mm,
  - b/ ramka dystansowa 6 mm
  - c/ witraż ok. 7 mm
  - d/ ramka dystansowa 6mm
  - e/ szkło float 4 mm

*(rysunek na następnej stronie)*
13. Montaż kwater w pierwotnym miejscu.

**SCHEMAT OCHRONNEGO ZESPOLENIA  
WITRAŻA W PAKIET 3-SZYBOWY**

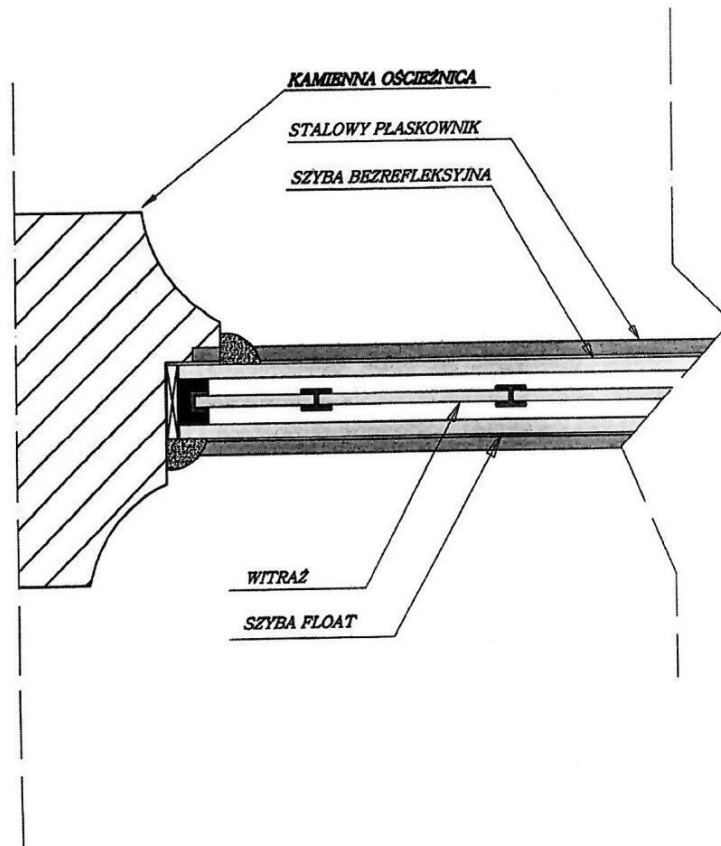


**OKNO WITRAŻOWE Z ELEWACJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA  
ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE**

**22.11.2018**




3 OKNA  
WITRAŻOWE Z  
ELEWACJI  
ZACHODNIEJ -  
POŁOŻENIE


3 OKNA  
WITRAŻOWE Z  
ELEWACJI  
ZACHODNIEJ -  
POŁOŻENIE

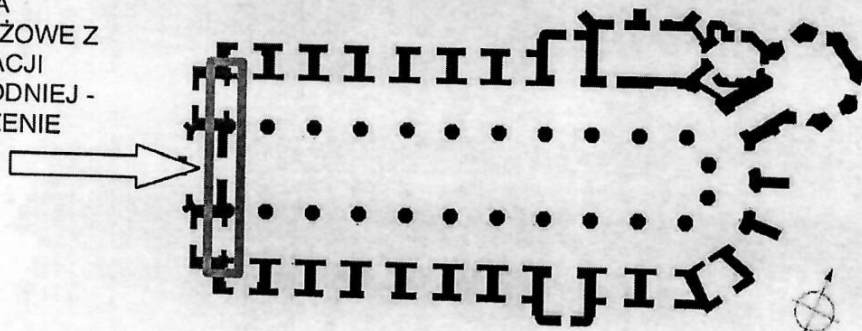


Plan kościoła św. Józefa (Lwów, Agnieszki w Nysie)

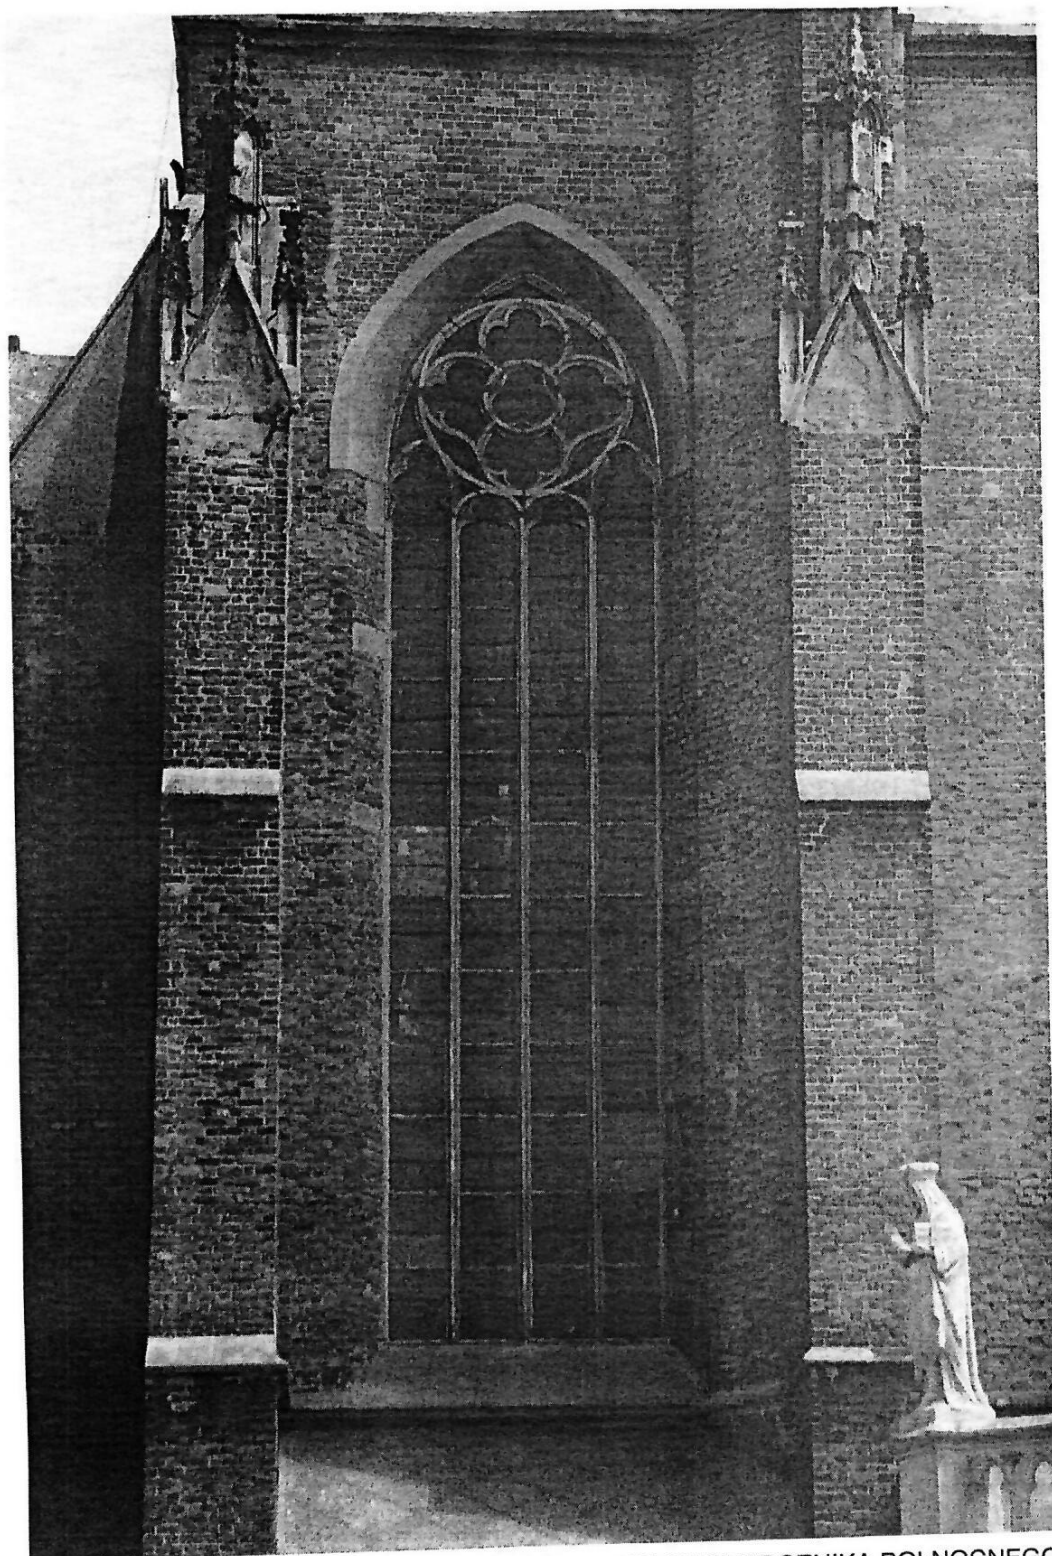


ELEWACJA ZACHODNIA, OKNO OD STRONY NAROZNIKA POŁNOCNEGO

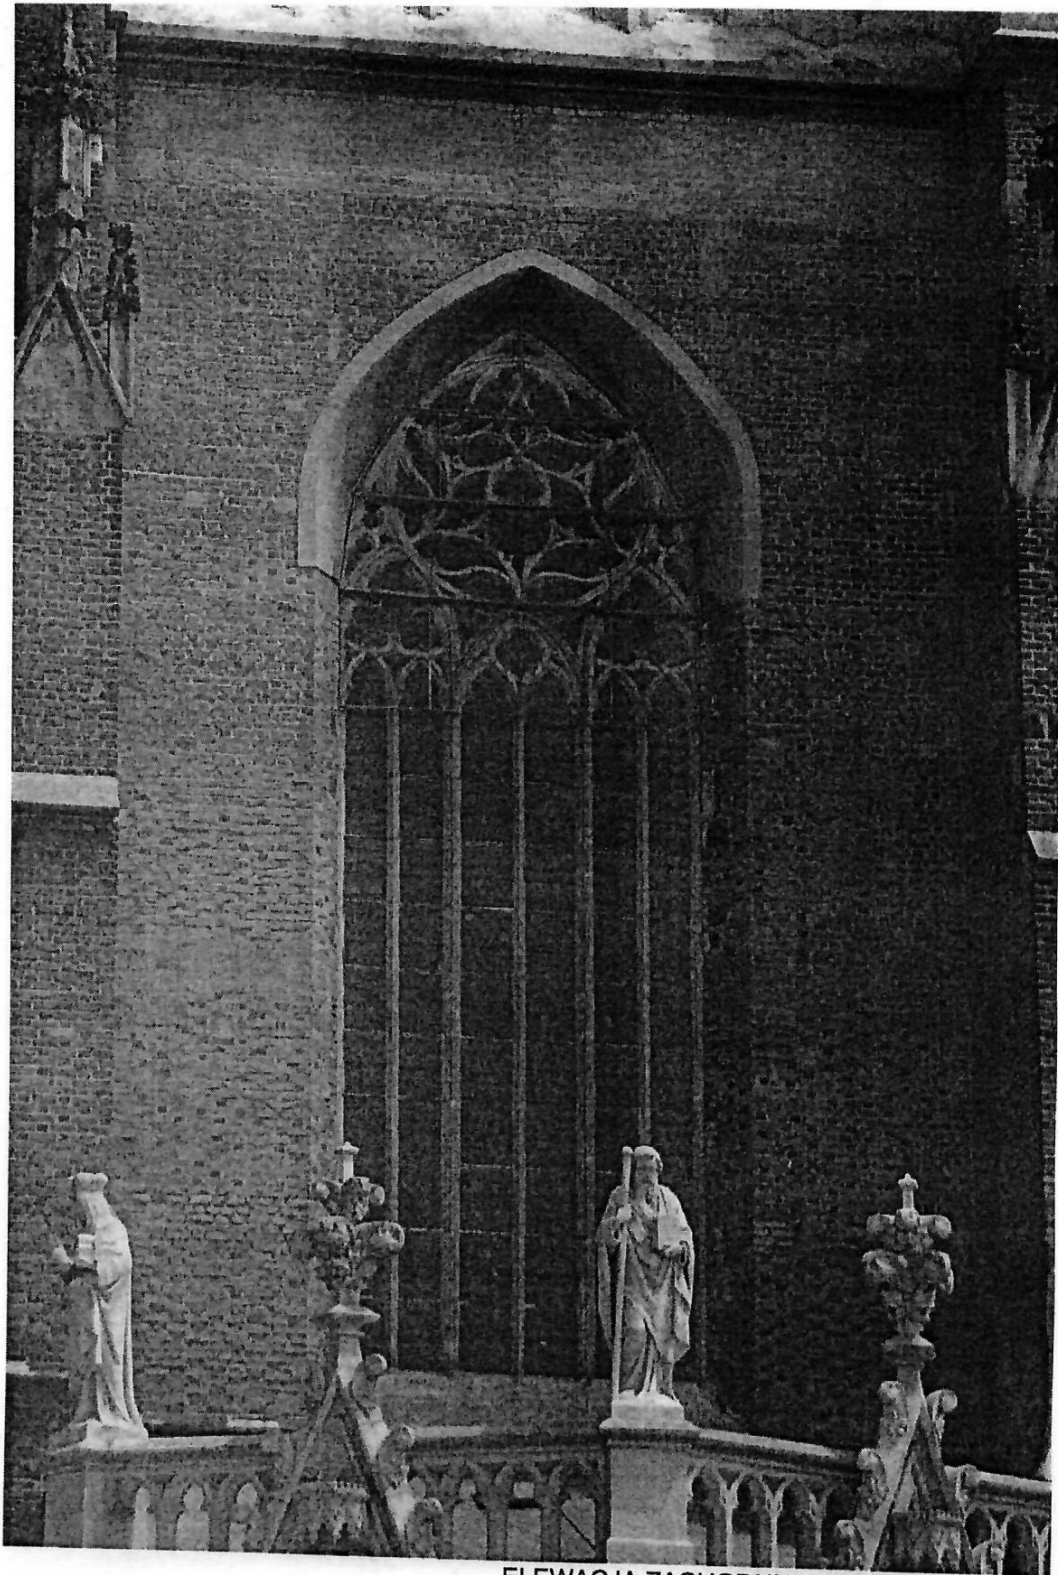


ELEWACJA ZACHODNIA, OKNO SRODKOWE

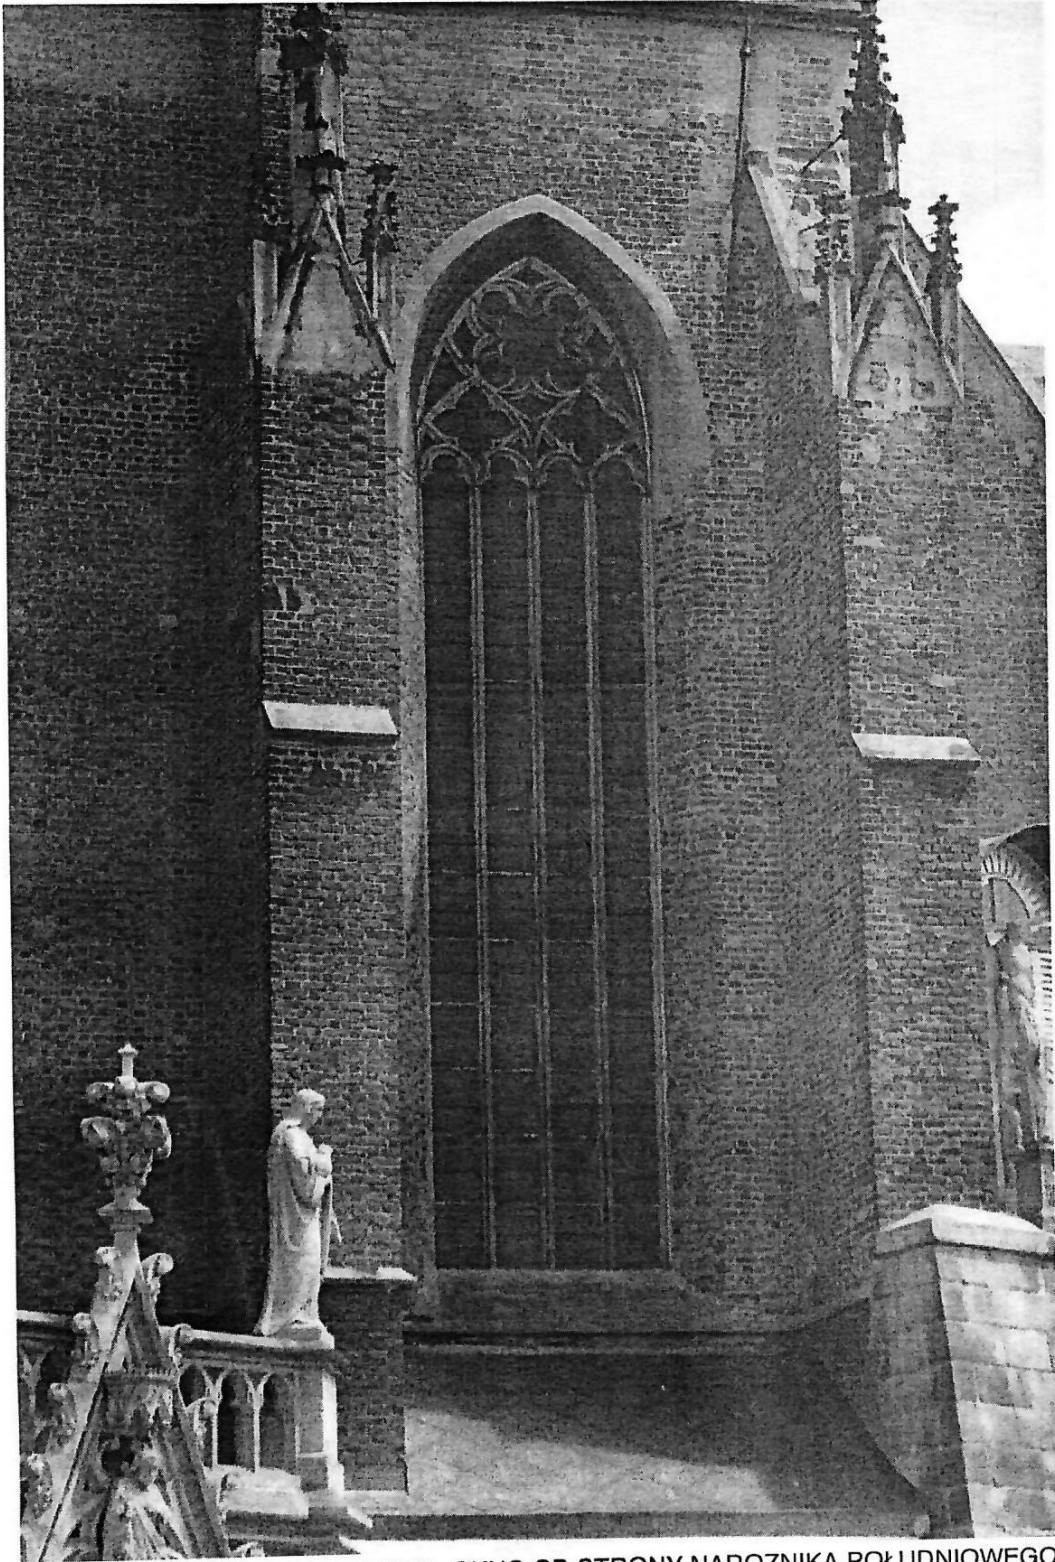


ELEWACJA ZACHODNIA, OKNO OD STRONY NAROZNIKA POŁUDNIOWEGO

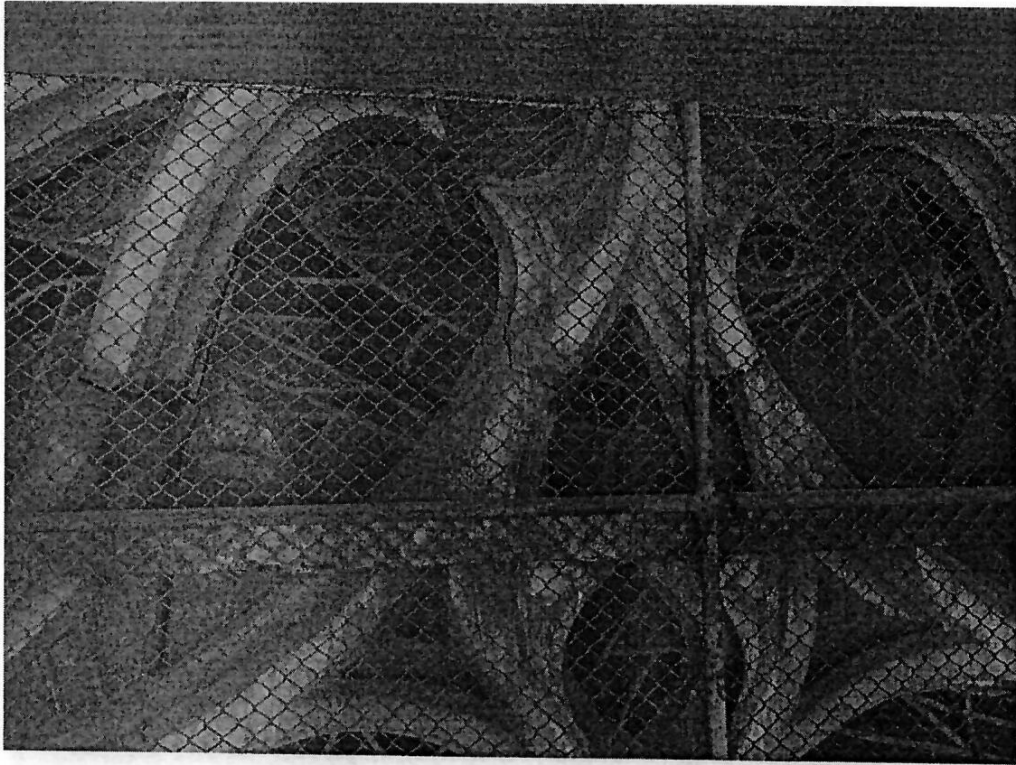


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

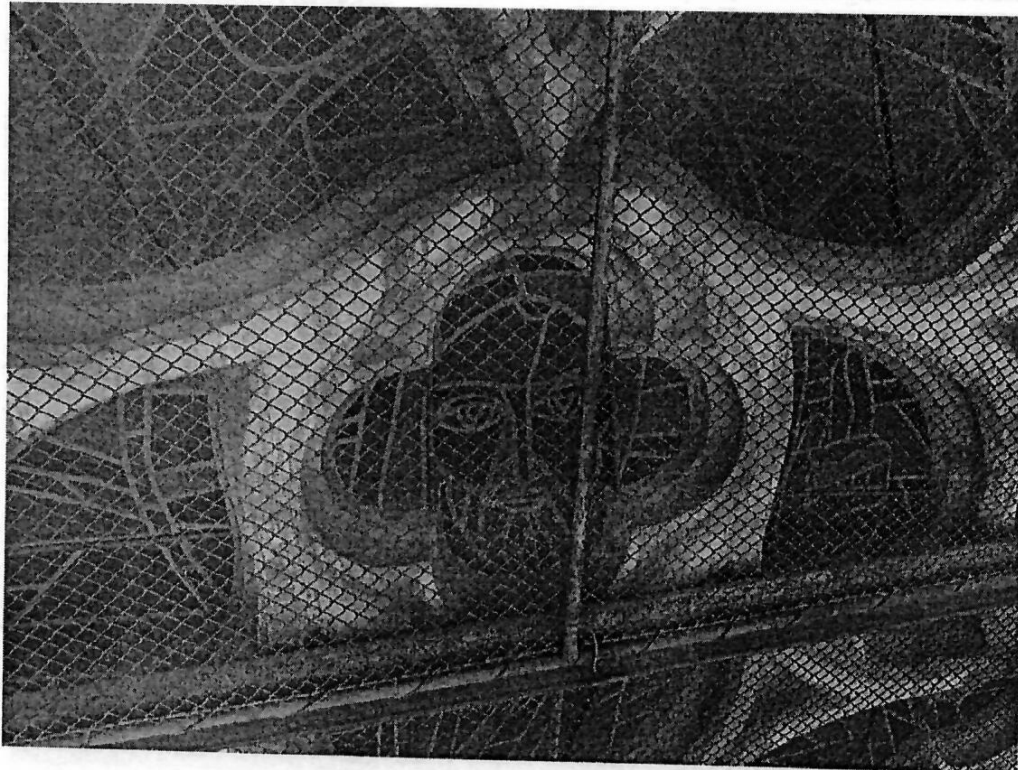


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

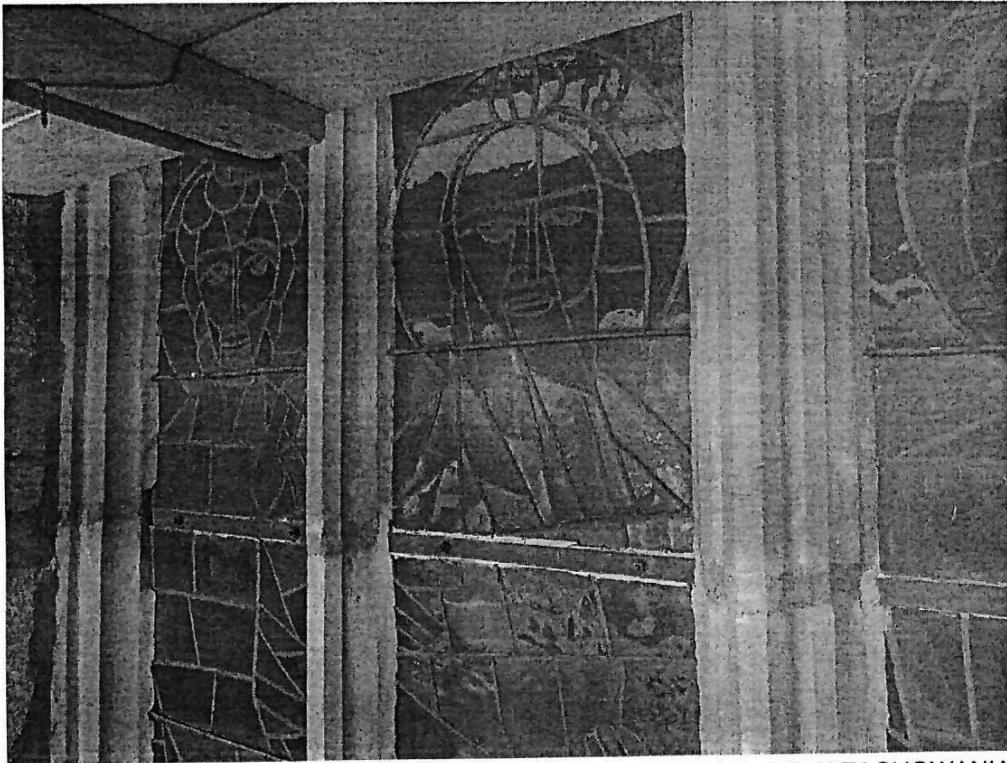


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

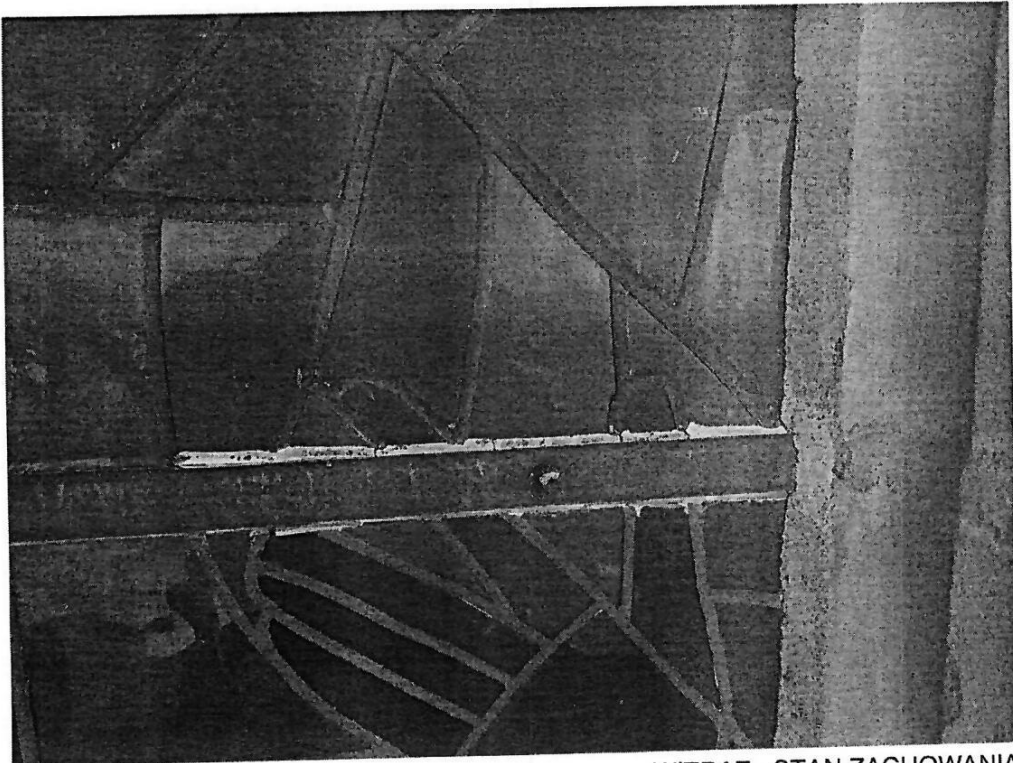


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

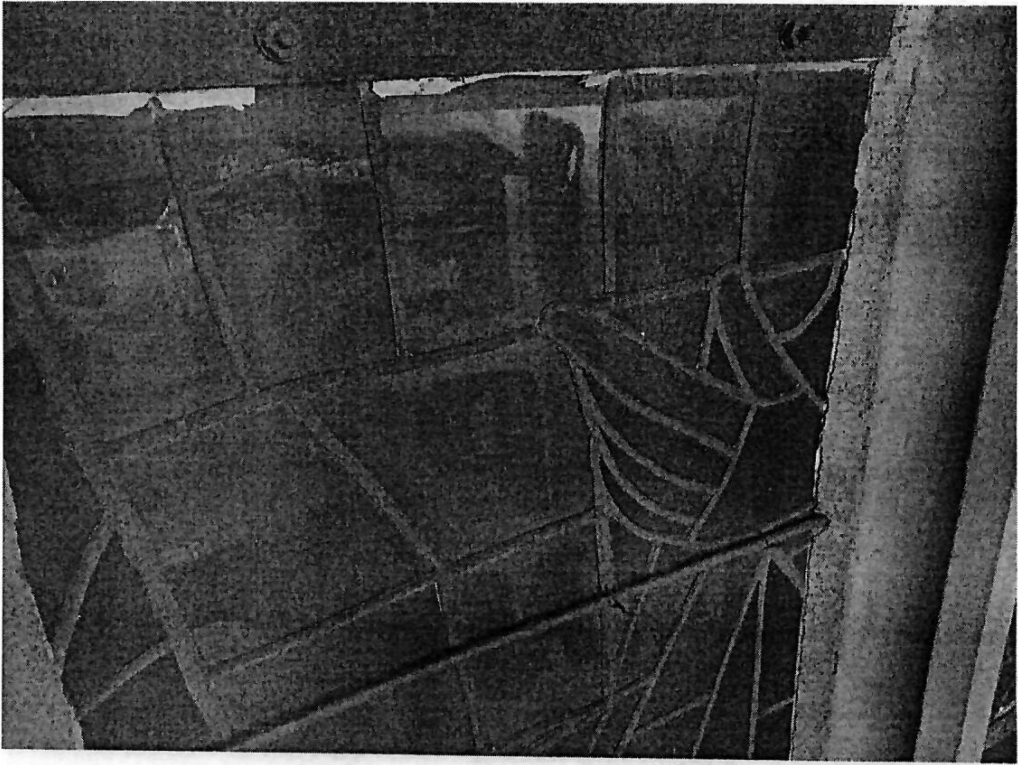


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

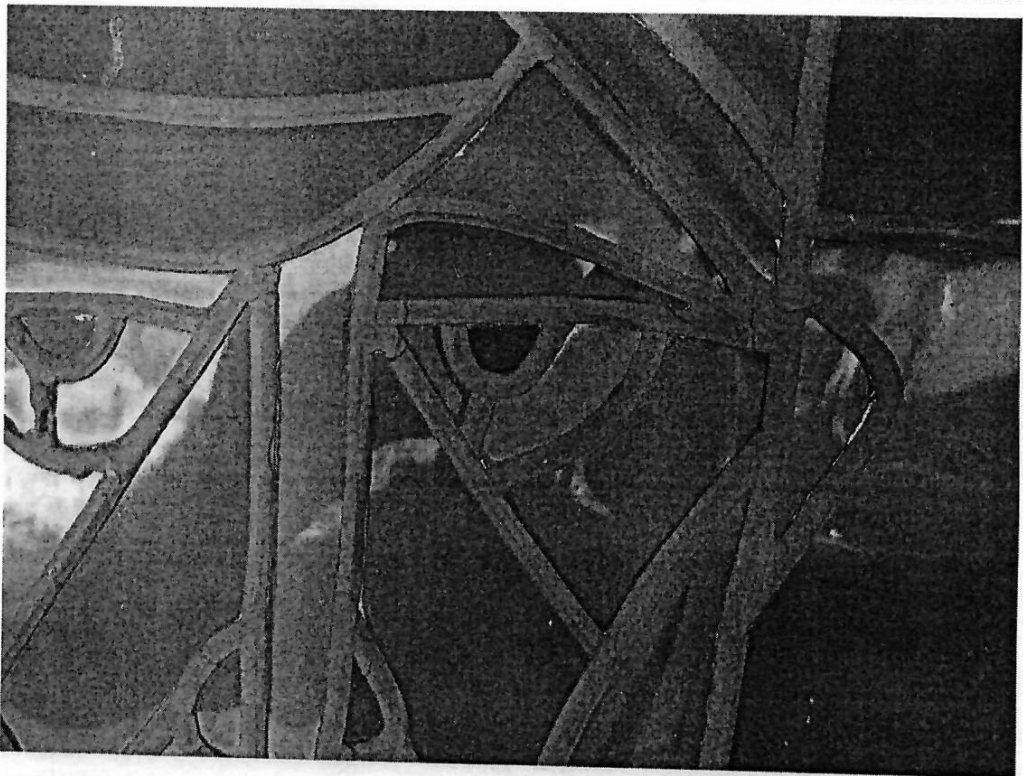


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

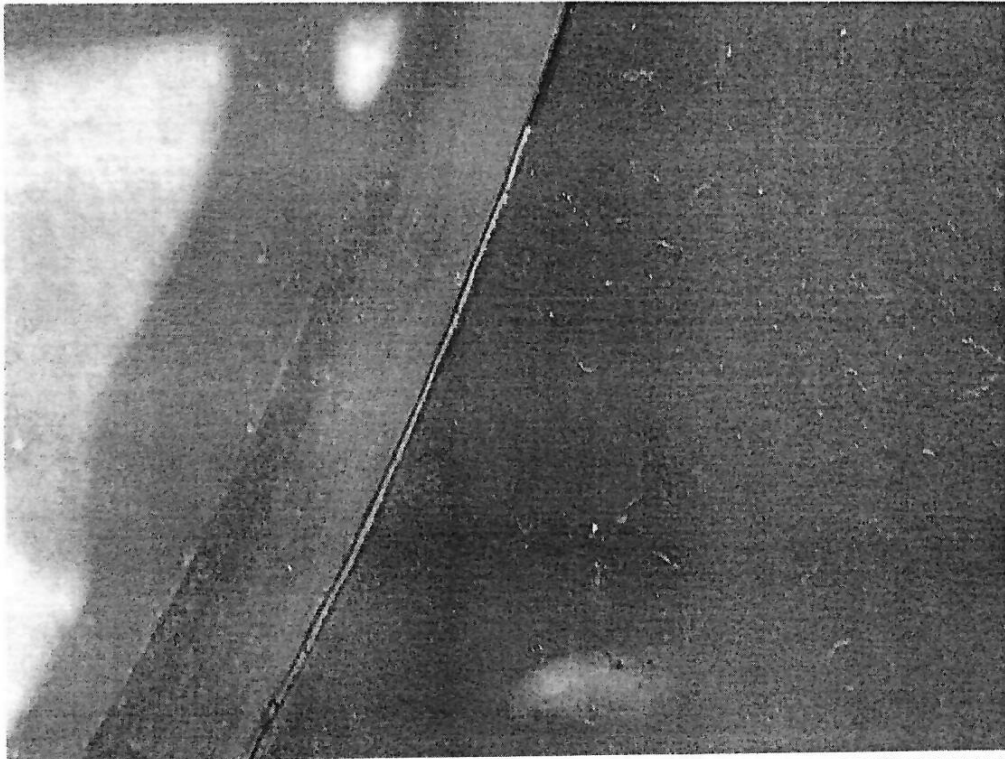


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

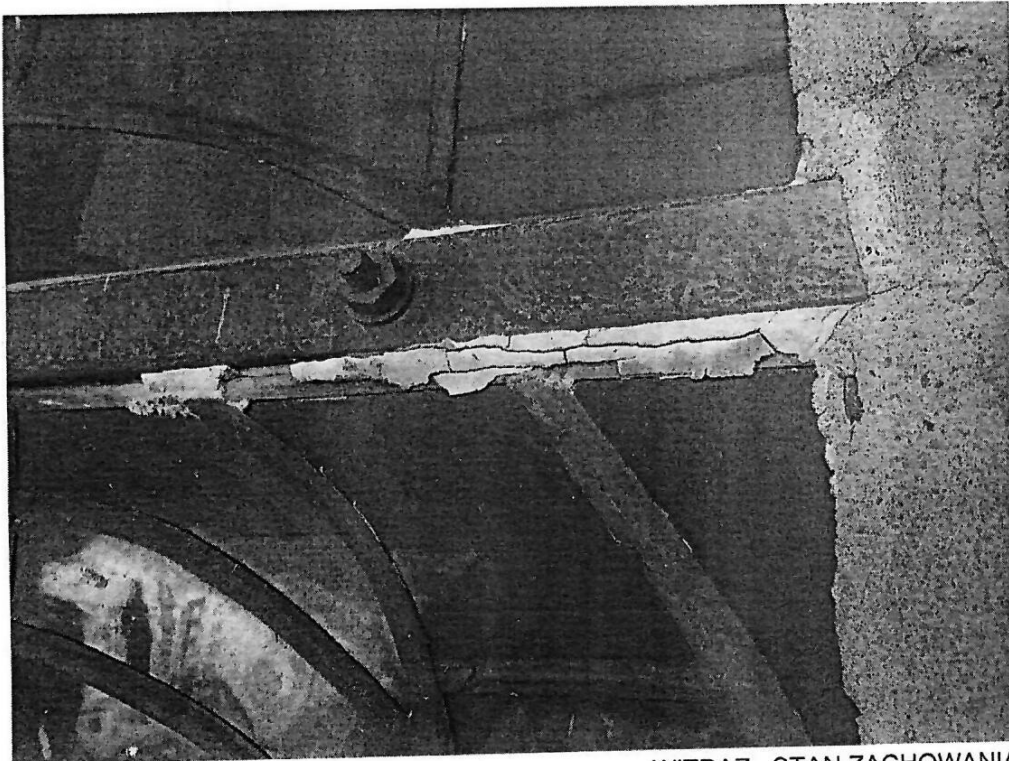




WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

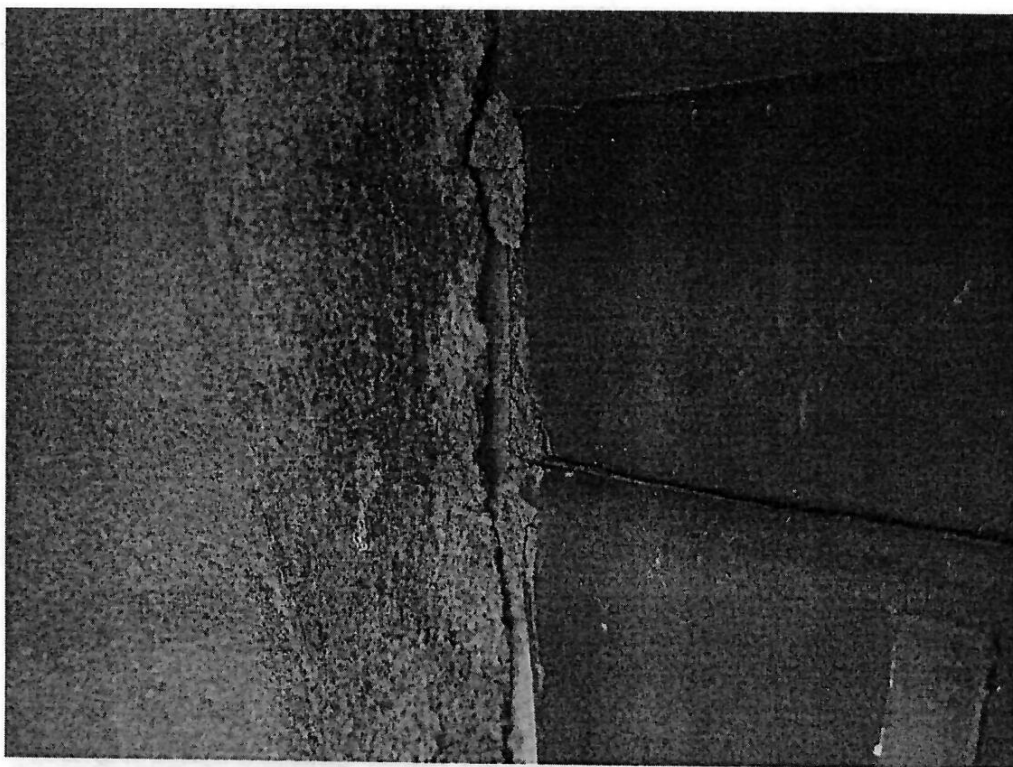



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

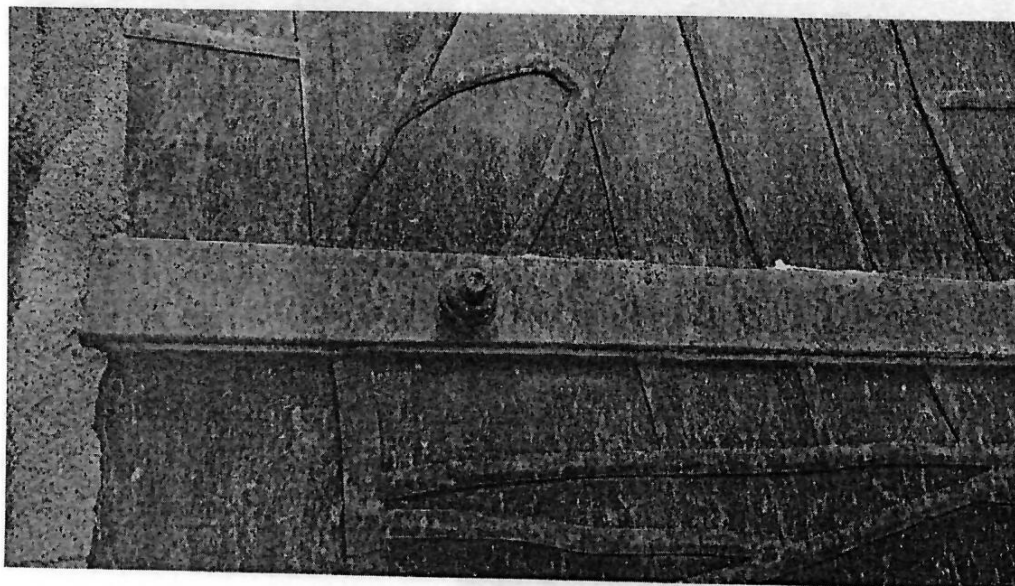


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

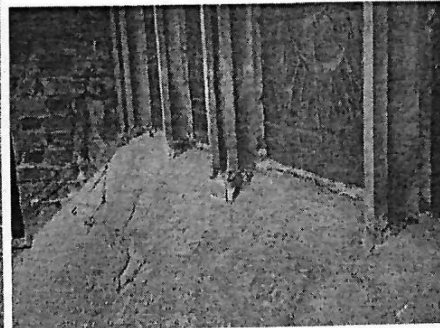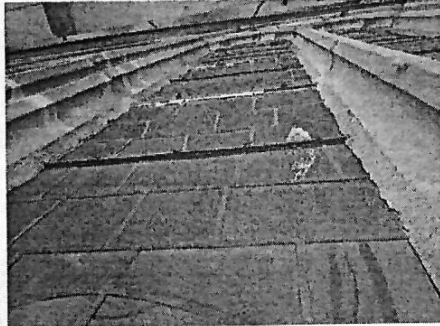
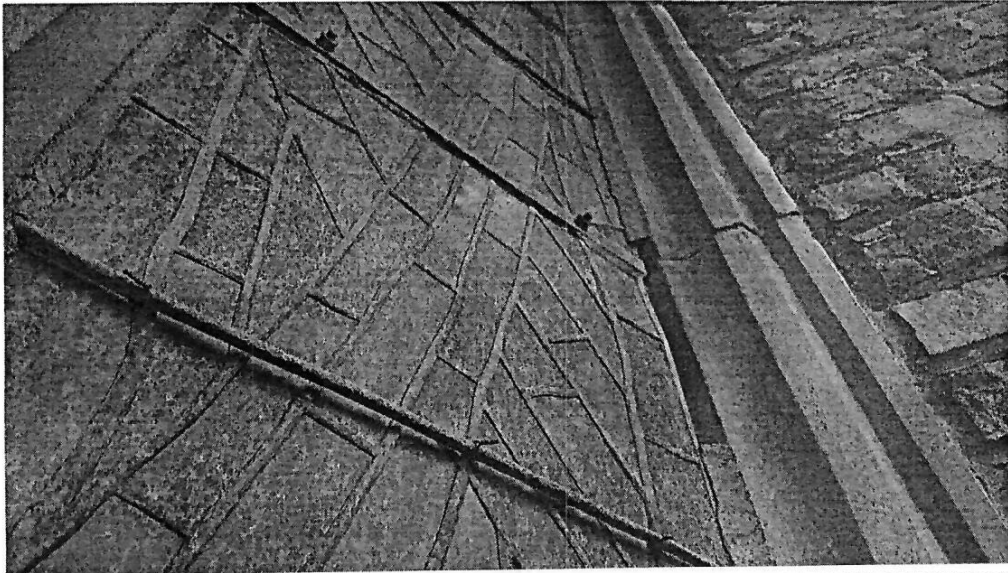


WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

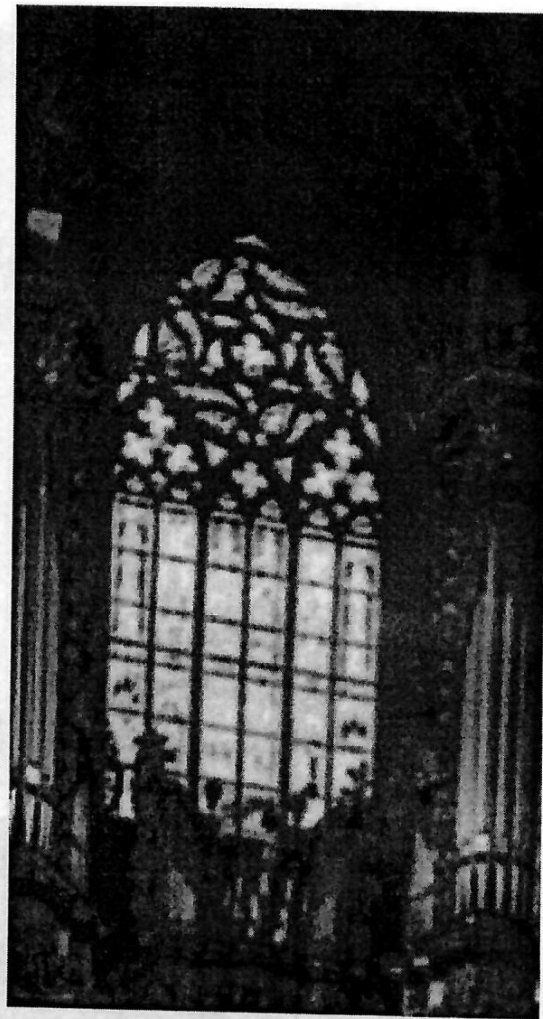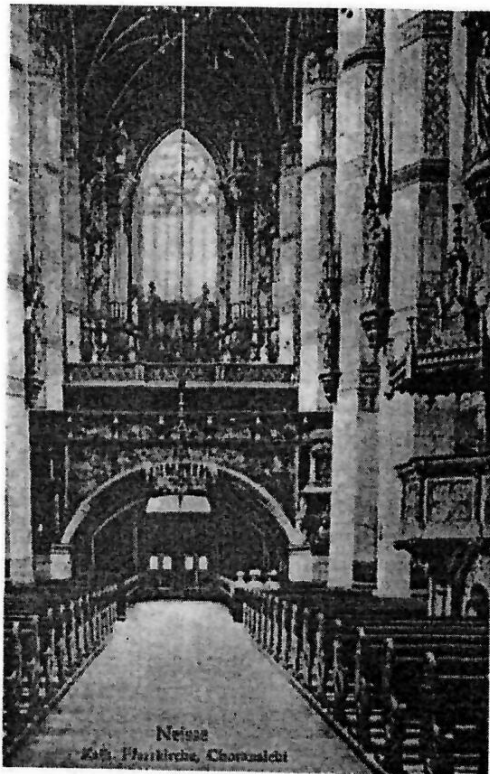



ARCHIWALNE ZDJĘCIA OKIEN  
WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI  
ZACHODNIEJ

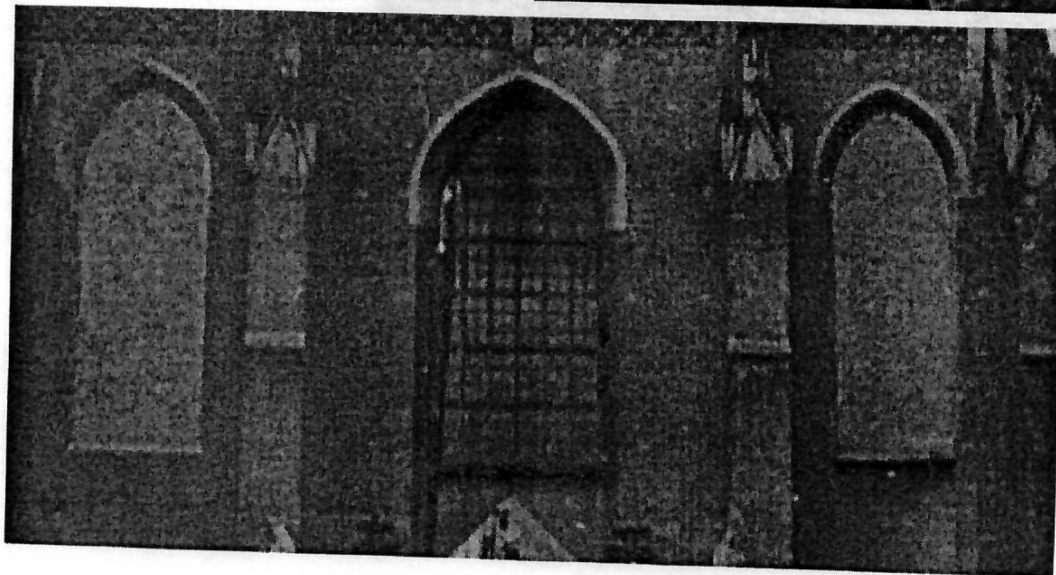

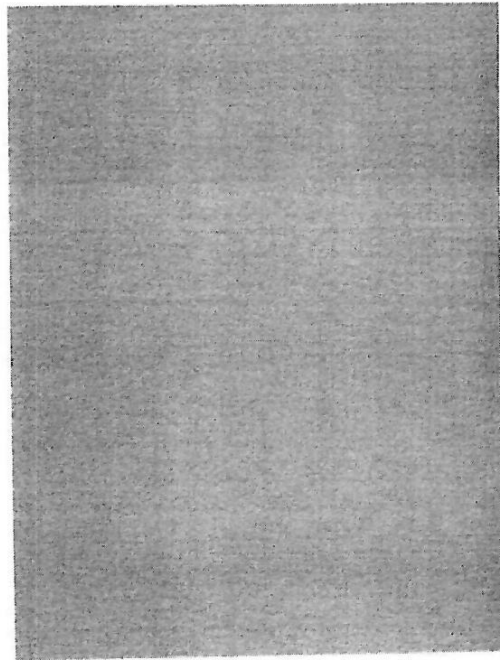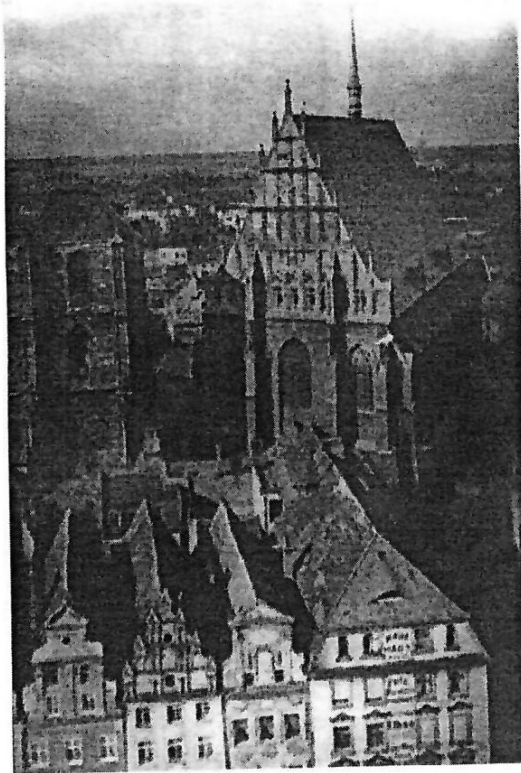


ARCHIWALNE ZDJĘCIA OKIEN  
WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI  
ZACHODNIEJ



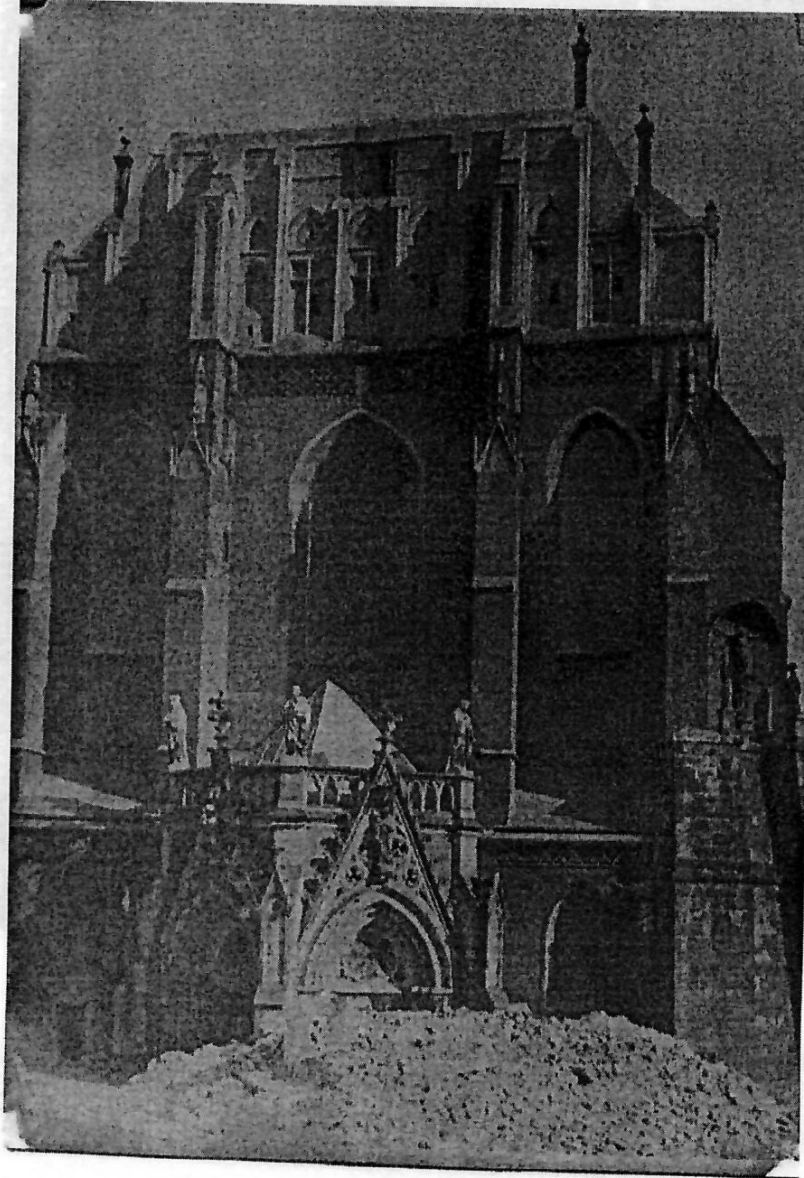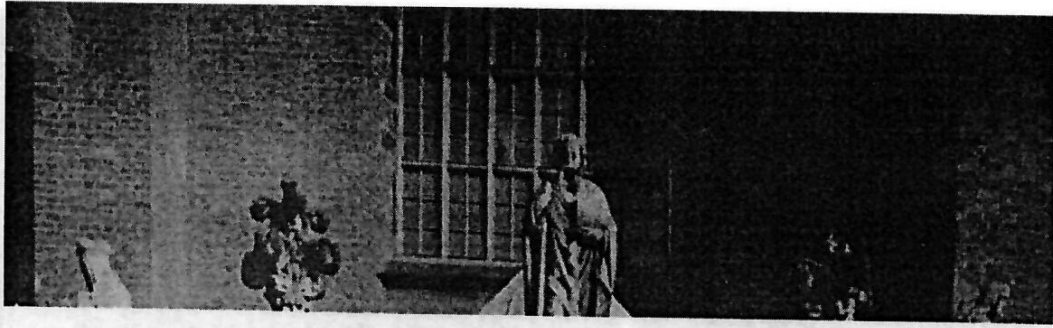

ARCHIWALNE  
ZDJĘCIA OKIEN  
WITRAŻOWYCH  
Z ELEWACJI  
ZACHODNIEJ

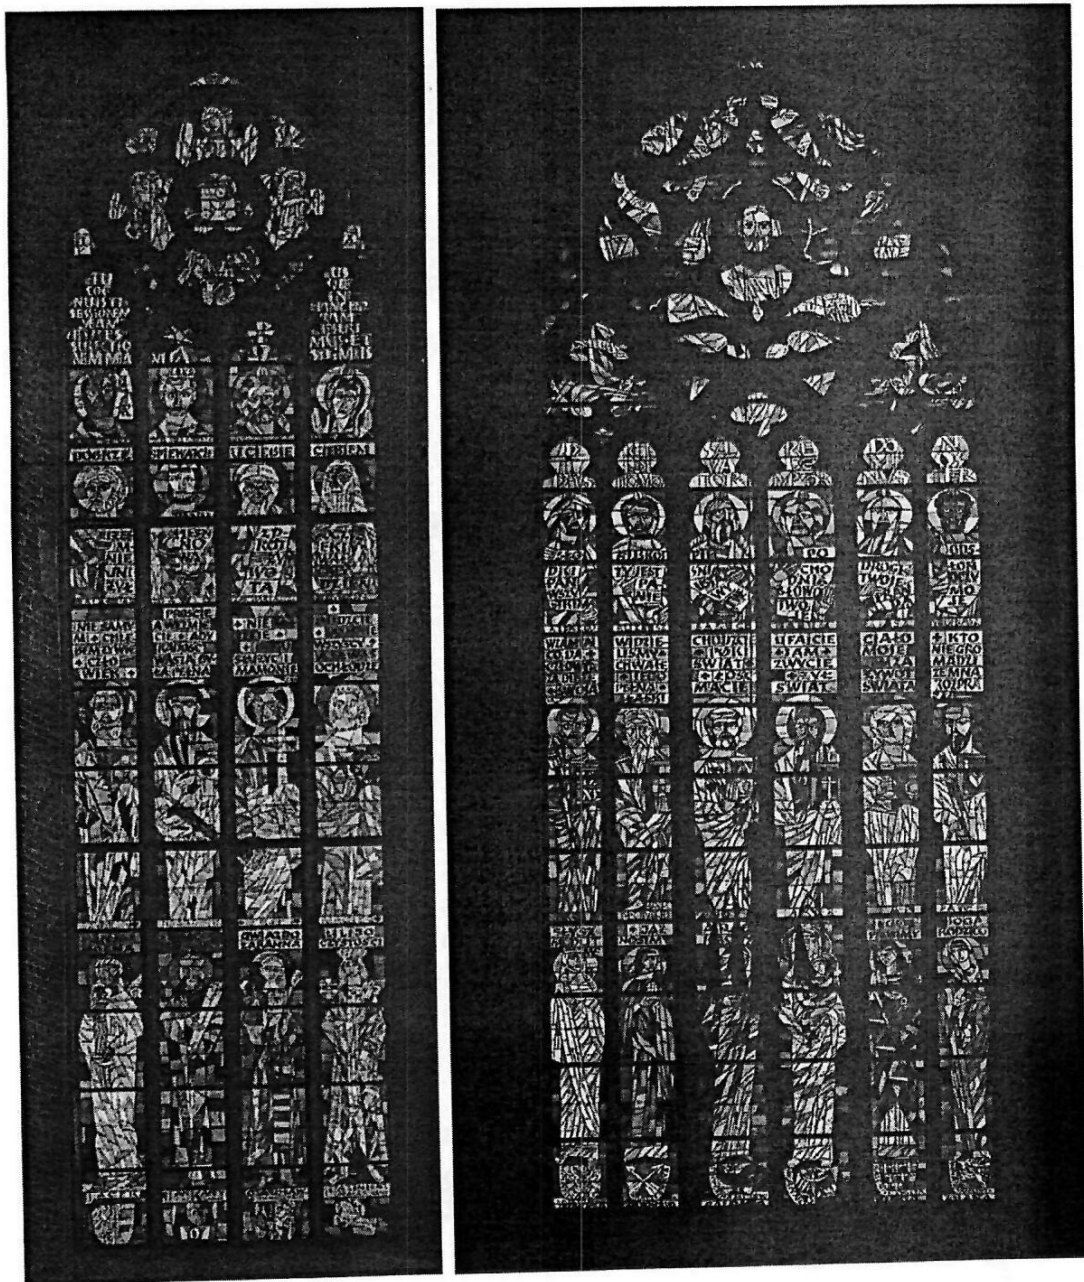

2 WITRAŻE Z ELEWACJI ZACHODNIEJ NYSKIEJ BAZYLIKI  
- WIDOK OD STRONY WNĘTRZA KOŚCIOŁA



PROJEKTY OKIEN WITRAZOWYCH DO  
NYSKIEJ BAZYLIKI - AUTOR ADAM  
STALONY-DOBRZAŃSKI

ilustracje ze strony [www.stalony-dobrzanski.info](http://www.stalony-dobrzanski.info)



Opolski  
Wojewódzki  
Konservator  
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl  
www.wuozopole.pl

Opole, dnia 21.12.2018 r.

ZN.5142.640.2018.KO

## DECYZJA NR 1186/N/2018

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1), art. 37 a, art. 6 ust. 1 pkt 1 litera c. art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

po rozpatrzeniu wniosku: Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego, ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina, w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie w zakresie renowacji trzech okien witrażowych z elewacji zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej: 172/55 decyzją z 28.09.1955 r.

na prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie w zakresie renowacji trzech okien witrażowych z elewacji zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, według programu prac konserwatorskich autorstwa mgr Jacka Gryczewskiego z listopada 2018r, uzgodnionego pod nr ZN.5142.640.2018.KO.

odmawiam wydania pozwolenia na prace w kościele pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie w zakresie zabezpieczenia trzech witraży z elewacji zachodniej kościoła dodatkowymi szybami od zewnętrznej i wewnętrznej strony.

**Warunki konserwatorskie:** na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków określa się warunki polegające na obowiązku:

- 1) kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi przez osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 2) przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska, adresu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków, kierownika prac konserwatorskich i prac restauratorskich, a także oświadczenie ww. osoby o przejściu obowiązku kierowania powyższymi pracami, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac;
- 3) w przypadku zmiany kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich w toku robót budowlanych, przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany, imienia, nazwiska, adresu oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osoby;
- 4) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
- 5) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

6) dokonania odbioru konserwatorskiego z udziałem OWKZ.

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do 31.12.2019 r.

*Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.*

**Uzasadnienie:**

W dniu 29.11.2018 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7. 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego, ul. Zagrodowa 5. 48-320 Sidzina, w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie w zakresie renowacji trzech okien witrażowych z elewacji zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej: 172/55 decyzją z 28.09.1955 r.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru oraz prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru. W myśl art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy, ochrona zabytków polega, w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwale zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

Analiza załączonych dokumentów wykazała, iż w zakresie planowanej inwestycji jest przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich polegających na renowacji trzech okien witrażowych z elewacji zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie.

Pochodzący z XIV w. kościół pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki, wybudowany w stylu gotyckim jako pomnik historii posiada wartość historyczną, artystyczną i naukową oraz duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego. Przedmiotowy obiekt mocno ucierpiał wskutek działań II Wojny Światowej. W 1956 roku podjęto gruntowną odnowę kościoła. Przedmiotowe witraże projektu Adama Stalony-Dobrzyńskiego, wykonane w pracowni Ryniewicza z Krakowa, zostały osadzone w otworach okiennych znajdujących się w obrębie elewacji zachodniej kościoła w 1960 r. Witraże wkomponowano w wysokie, ostrołukowe otwory okienne z dekoracją maswerkową.

W ocenie stanu zachowania obiektu, będącej elementem programu prac konserwatorskich autorstwa mgr Jacka Gryczewskiego, określono stan techniczny witraży jako bardzo zły. Stwierdzono duże odkształcenia płaszczyzn pól witrażowych, liczne pęknięcia taśm ołowianych, ubytki w kicie oraz rozkruszenie miejsc lutowanych. Powierzchnia witraży jest mocno zabrudzona, elementy stalowe skorodowane.

Przedmiotowe prace w zakresie oczyszczenia szklanych kwater, usunięcia nawarstwień korozyjnych z elementów stalowych, uzupełnienia ubytków szkła, wymiany ram brzegowych oraz ramek ołowianych, mają na celu poprawę stanu zachowania i estetyki witraży oraz utrwalenie substancji zabytkowej.


Montaż witraży w dodatkowych pakietach szklanych wpłynie niekorzystnie na plastykę maswerków. Wskutek montażu pakietów szklanych profile elementów kamieniarskich w oknach ulegną spłyceniu. Efekt ten pogorszy odbiór wizualny okien. Nie ma również gwarancji, iż pakiety szklane stworzą odpowiedni mikroklimat dla szkła witrażowego. Dodatkowe oszklenie może stworzyć barierę, która utrudni cyrkulację powietrza. Gromadząca się woda oraz para wodna pomiędzy szybami będzie działać destrukcyjnie na witraże, skutkiem czego parametry techniczne oraz estetyka witraży może ulec pogorszeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę planowana inwestycja w zakresie renowacji witraży, przy zachowaniu ww. warunków konserwatorskich, może zostać zrealizowana. Nie dopuszcza się zabezpieczenia przedmiotowych witraży dodatkowymi szybami od zewnętrznej i wewnętrznej strony. Nie dopuszcza się montażu witraży w dodatkowych pakietach szklanych.

Zgodnie z treścią przytoczonego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

*Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). W trakcie biegu*

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).



OPOLSKI  
KONSERWATOR  
ZABYTKÓW

**Pouczenie:**

Investor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z cytowanego wyżej rozporządzenia, w szczególności:

1) Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

2) OWKZ wstrzymuje wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia OWKZ na prowadzenie wstrzymanych prac przy zabytku, albo
- c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin ich wykonania.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), OWKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), OWKZ wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazanym sposób, w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego).

6) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić OWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

7) Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia (art. 107d ust. 1, 2, 5 ustawy).

8) Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów magisterskich, w zakresie zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeów będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

9) Wnioskodawca winien przekazać Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu imię, nazwisko i adres osoby kierującej pracami konserwatorskimi, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37 a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także oświadczenie ww. osoby o przejęciu obowiązku kierowania powyższymi pracami, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac przez osobę;

**Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), według rozdzielnika:**

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, na ręce pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego, ul. Zagrodowa 5, 48-320 Siedzina.
2. Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

**Do wiadomości:**

2. Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

a/a

na ręce

# PROJEKT ZABEZPIECZENIA SZKIEŁ WITRAŻOWYCH

OSTATNI ETAP REMONTU KONSERWATORSKIEGO OKIEN WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI  
ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

## OPRACOWANIE:

Jacek Gryczewski, dyplomowany konserwator zabytków

ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina


Ryszard Kubik, konstruktor

ul. Królowej Jadwigi 18, 48-340 Głuchołazy

Nysa, 10.03.2019




**RYSZARD KUBIK**  
INŻYNIER BUDOWNICTWA  
upr. do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
i konstrukcyjno-budowlanej  
nr upr.30/71Op, OPL/1498/WBK/18

  
**mgr Jacek Gryczewski**  
dyplomowany konserwator zabytków  
uprawnienia - dyplom UMK w Toruniu  
nr 1885 z dn. 27.09.1996r.  
ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina

## OPIS OBIEKTU

Projekt prac jest uzupełnieniem do rozpoczętych prac konserwatorskich przy trzech oknach witrażowych z zachodniej elewacji kościoła pw. Św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Autorem projektu okien jest Adam Stalony-Dobrzański.

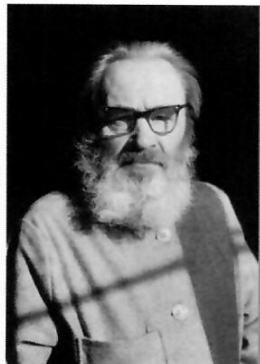

Adam Stalony-Dobrzański (1904–1985), malarz, grafik, konserwator dzieł sztuki, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Urodzony 19 listopada w Menie w guberni czernihowskiej, (obecnie na Ukrainie).

W latach 1956–69 realizuje zespoły witraży dla kościoła parafialnego, obecnie bazyliki w Zawierciu, w latach 1953–69 dla cerkwi w Gródku koło Białegostoku. W latach 1953–61 wykonuje polichromię i witraże w kościele parafialnym w Rozwadowie, a w okresie 1958–67 witraże do okien chóru dla gotyckiej katedry w Nysie (na podstawie: [www.stalony-dobrzanski.info](http://www.stalony-dobrzanski.info)).

Okna powstały w latach 1958-1967.

## STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Stan zachowania szkła, elementów stalowych i kamiennych maswerków tworzących całość jest bardzo zły. Elementy kamienne nie są jednak przedmiotem obecnego opracowania.

Stwierdzono występowanie znacznych odkształceń płaszczyzn pól witrażowych spowodowane czynnikami mechanicznymi (np. naporem wiatru, być może uderzeniami ptaków).

W wielu miejscach zaobserwowano rozkruszenie miejsc lutowanych, pęknięcia taśm ołowianych oraz duże ubytki w kicie. Ponadto całość, szczególnie od strony zewnętrznej, jest pokryta brudem. Można zauważyć liczne plamy ptasich odchodów. Elementy stalowe (wiatrowniki, płaskowniki) pokryte są nawarstwieniami korozyjnymi.

W otoczeniu okien witrażowych prowadzone są prace budowlano-konserwatorskie. Na prace konserwatorskie przy szklach witrażowych zostało wydane pozwolenie nr 1186/N/2018 z dnia 21.12.2018.


## OCZEKIWANE EFEKTY PRAC

Znacznej poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Dodatkowa osłona ze szkła zabezpieczy okna przed działaniem czynników mechanicznych oraz chemicznych. Brud nie będzie osadzać się bezpośrednio na elementach zabytkowych, co ograniczy w przyszłości korozję szkła. Zabezpieczenie szkłem ochronnym poprawi odporność na wiatr i w górnej, maswerkowej części

okien istnieją zabezpieczenia wykonane z siatek. Zostaną one wymienione na podobne, wykonane z nowszych materiałów. Siatki zabezpieczają okna przede wszystkim przed gołębiami.

## **WSKAZANIE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA (METODY, MATERIAŁY I TECHNIKI)**

W górnej, maswerkowej części okien należy zdemontować istniejące siatki stalowe (fot. 1). W ich miejsce zamontować siatki nowe, o zwiększonej odporności na korozję.

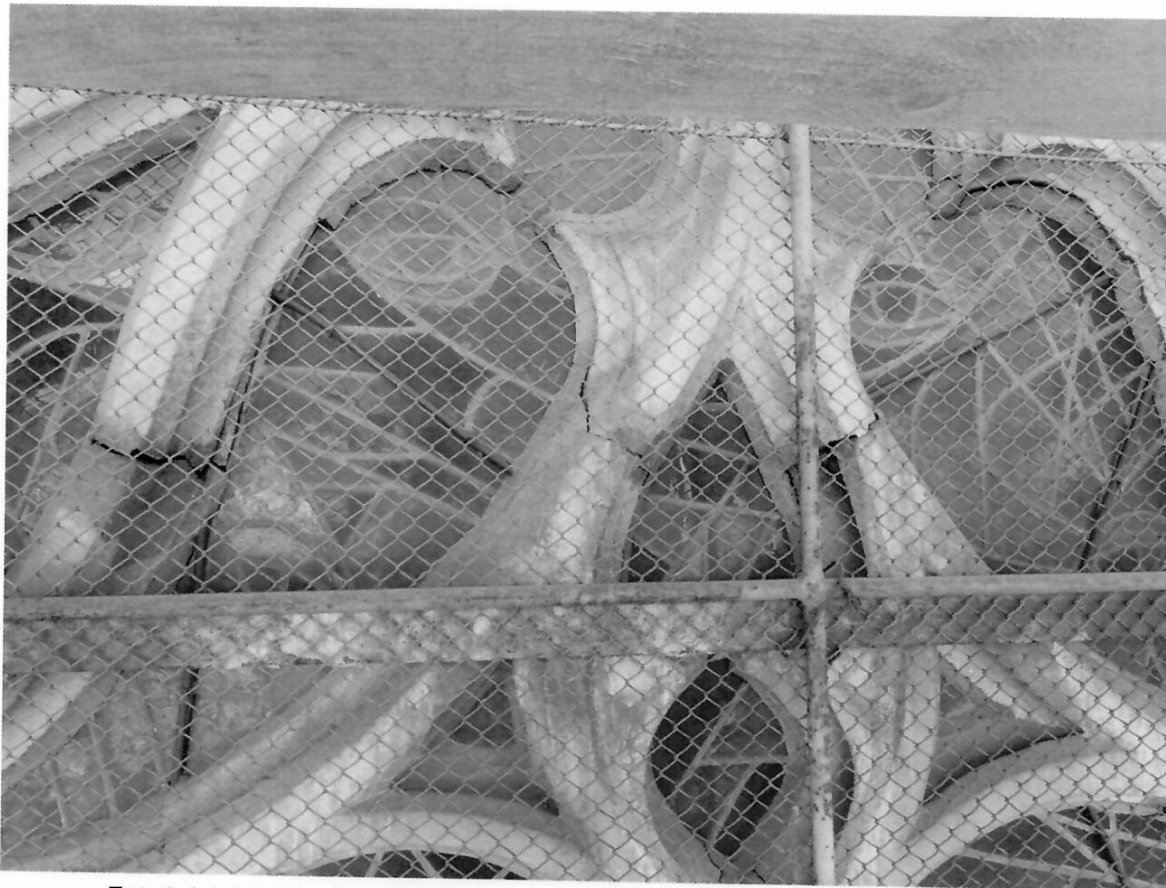


Fot. 1. Istniejące zabezpieczenie z siatek - okno witrażowe z elewacji zachodniej

W obszarach szklonych kwaterami prostokątnymi, do górnej krawędzi laskowań zostaną zamontowane szyby ochronne. Sposób montażu pokazano na rysunkach 1 i 2. Do szklenia zostanie wykorzystane szkło Vision - Lite o niskim współczynniku odbicia (załącznik 1).


**RYSZARD KUBIK**  
INŻYNIER BUDOWNICTWA  
upr. do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
i konstrukcyjno-budowlanej  
nr upr.30/71Op, OPL/1499/WBKb/18

**mgr Jacek Gryczewski**  
dyplomowany konserwator zabytków,  
uprawnienia - dyplom UMK w Toruniu  
nr 1885 z dn. 27.09.1996r.  
ul Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina

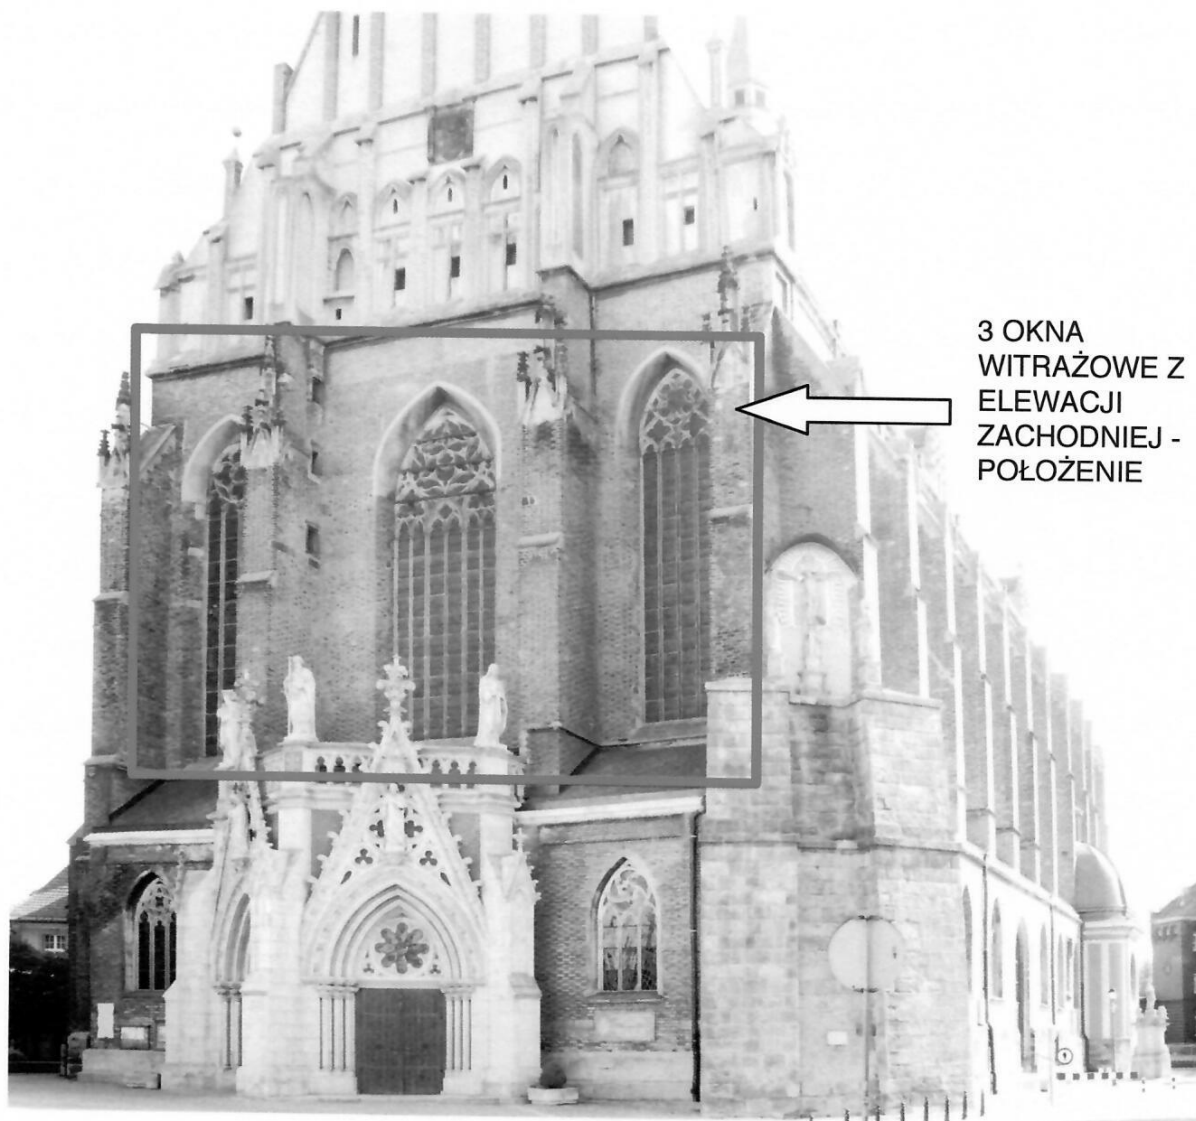

3 OKNA  
WITRAŻOWE Z  
ELEWACJI  
ZACHODNIEJ -  
POŁOŻENIE

3 OKNA  
WITRAŻOWE Z  
ELEWACJI  
ZACHODNIEJ -  
POŁOŻENIE

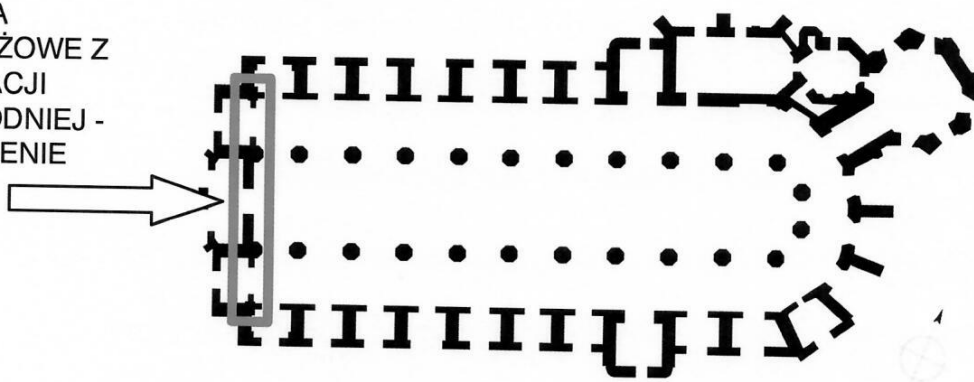



ELEWACJA ZACHODNIA, OKNO OD STRONY NAROZNIKA POŁNOCNIEGO




ELEWACJA ZACHODNIA, OKNO ŚRODKOWE



ELEWACJA ZACHODNIA, OKNO OD STRONY NAROZNIKA POŁUDNIOWEGO



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

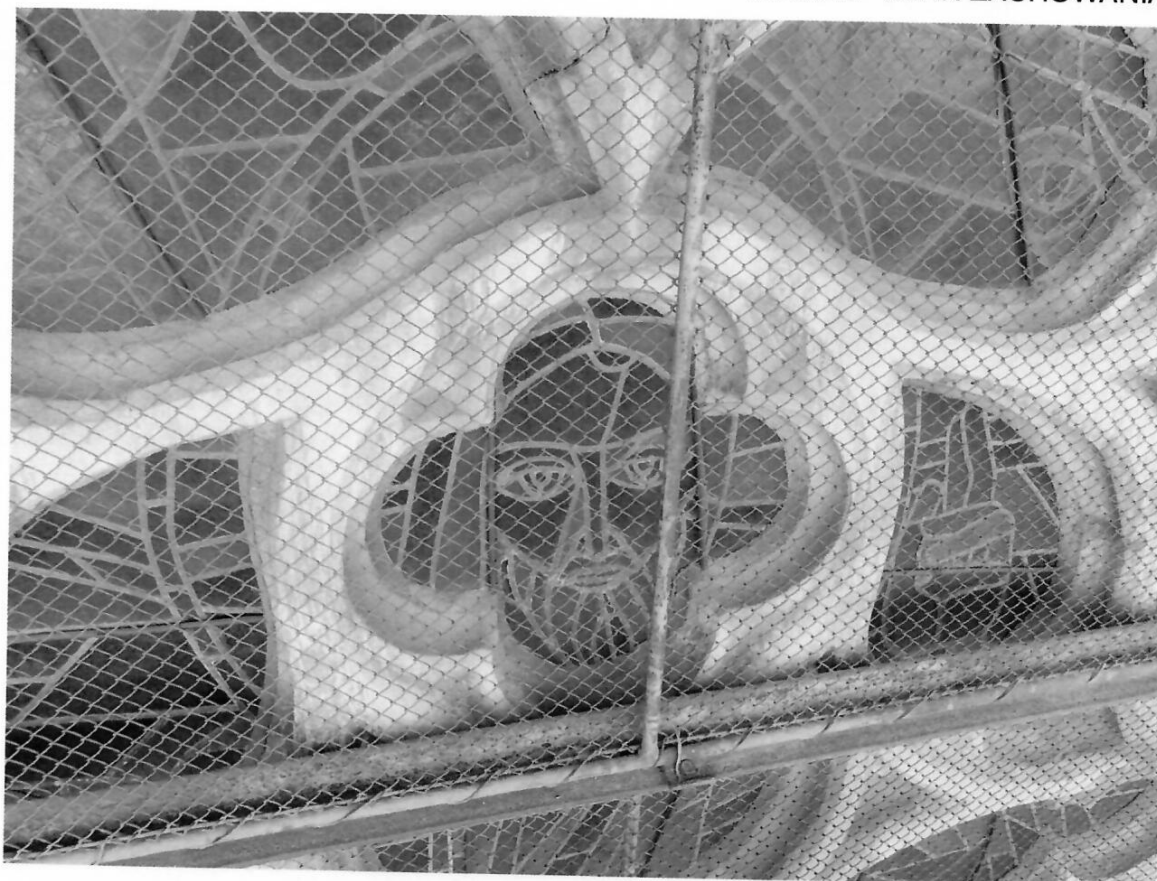

WITRAZ - STAN ZACHOWANIA




WITRAZ - STAN ZACHOWANIA



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

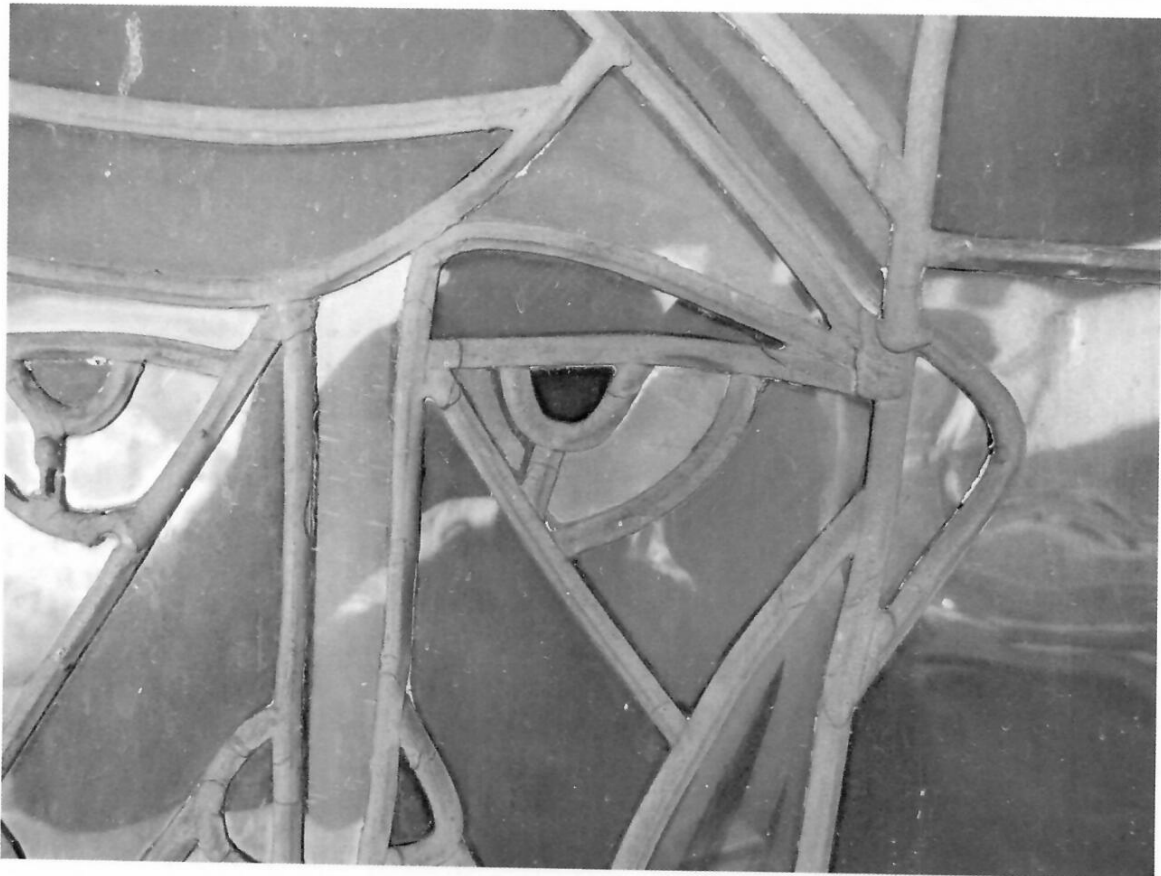

WITRAZ - STAN ZACHOWANIA



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA





WITRAZ - STAN ZACHOWANIA



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA



WITRAZ - STAN ZACHOWANIA

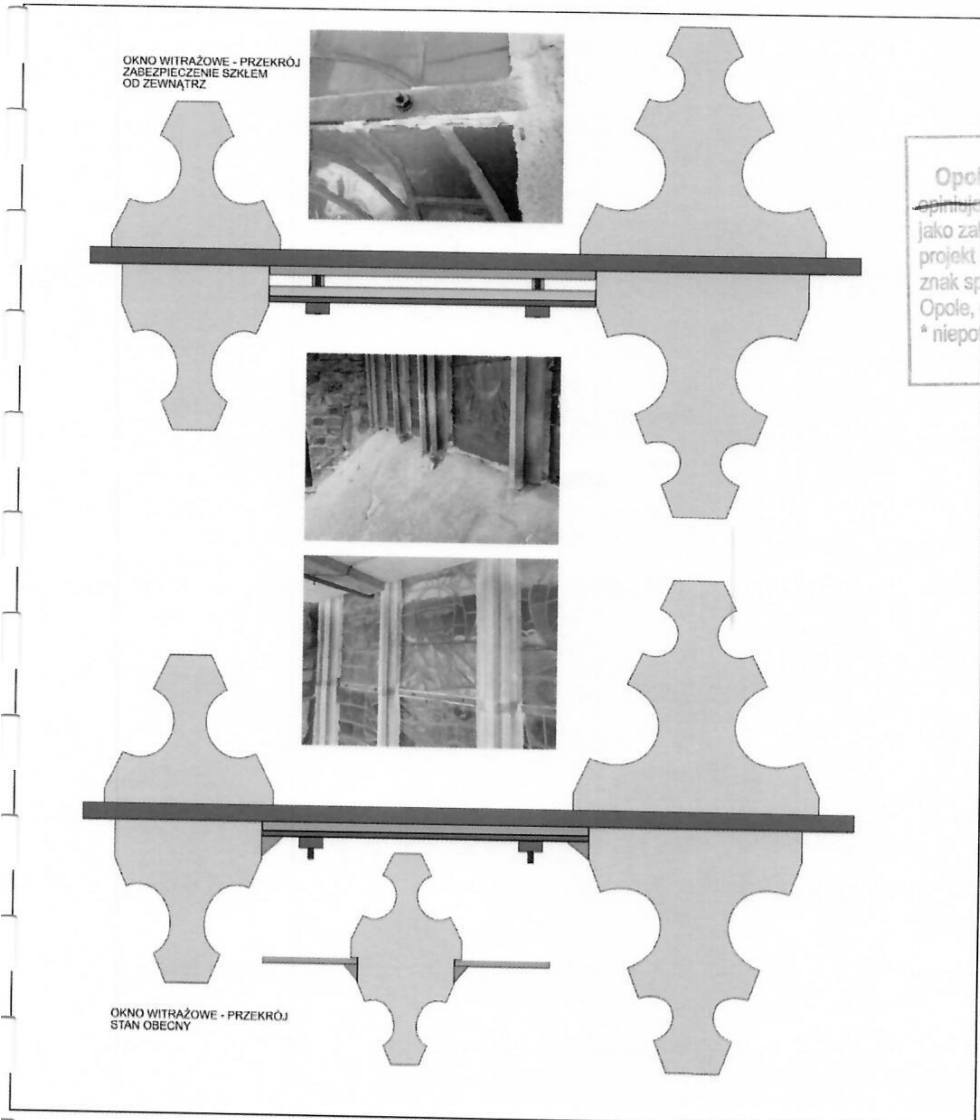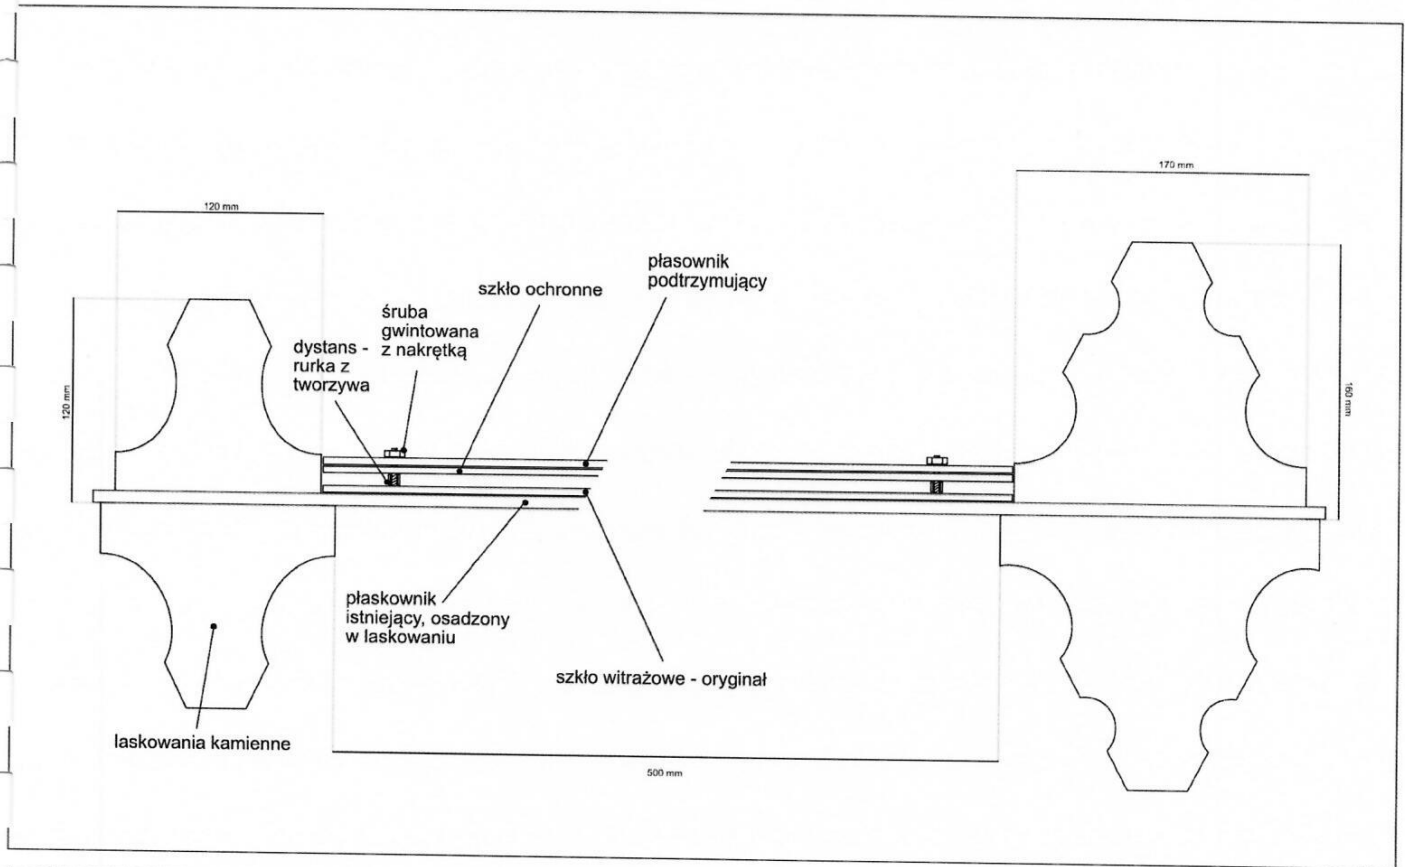

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
 opinia/uzgodnia\* .....  
 jako załącznik do projektu/decyzji/pozwolenia\*  
 projekt budowlany/projekt konserwatorski/.....  
 znak sprawy: 2N.5142.74.2019.KO  
 Opole, dnia .....  
 \*niepotrzebne skreślić

21 MAR. 2019



Podpis

OPOLSKI WOJEWÓDZKI  
 KONSERWATOR ZABYTKÓW

Elżbieta Wołak

Rysunek 01

Sposób montażu  
 ochronnego szkła  
 - przekrój poziomy

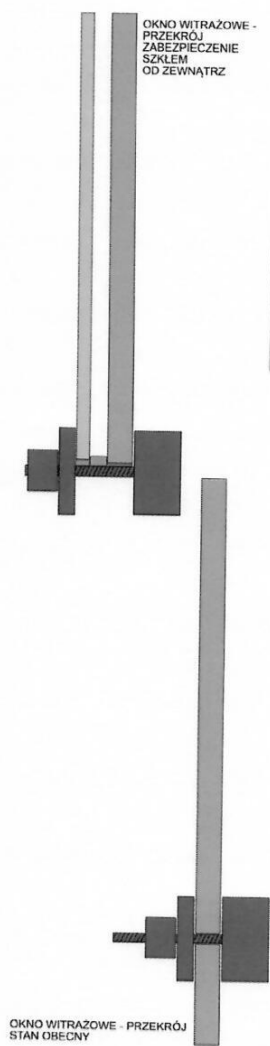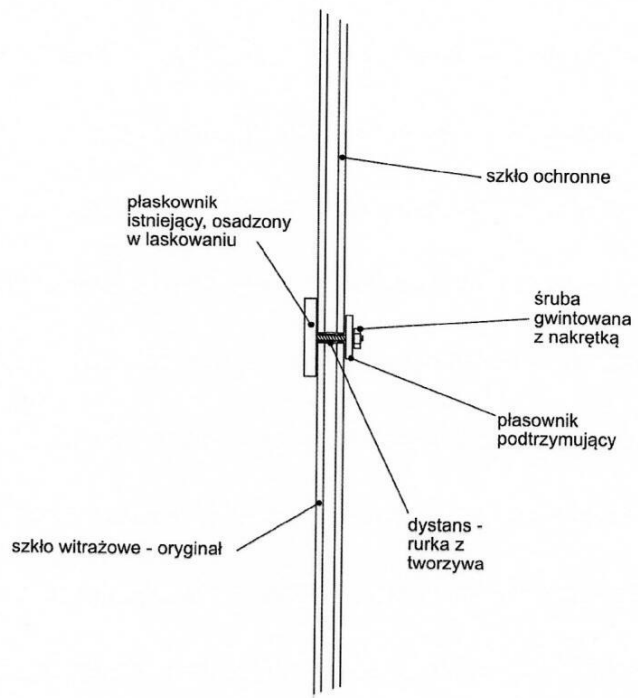

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
 Opole, dnia 21 MAR. 2019  
 jako załącznik do projektu budowlanego  
 znak sprawy: 2N.5142.74.W.15.KO  
 \*niepotrzebne skreślić\*

OPOLSKI WOJEWÓDZKI  
 KONSERWATOR ZABYTKÓW  
 Elżbieta Molak

Rysunek 02  
 Sposób montażu  
 ochronnego szkła  
 - przekrój pionowy

## **Załącznik 1**

Szkło VISION-LITE, opis producenta

# VISION-LITE

Zobacz piękno wewnątrz



BUILDING GLASS POLSKA

  
SAINT-GOBAIN

# VISION-LITE

## ZOBACZ PIĘKNO WEWNĄTRZ



### OPIS

VISION-LITE ogranicza zjawisko odbicia światła.

Dzięki powlekanii powierzchni szkła bazowego tlenkami metali metodą katodowego napyłania uzyskuje się produkt pozbawiony, zasłaniających widok, refleksów.

### ZASTOSOWANIE

VISION-LITE nadaje się zwłaszcza do takich zastosowań, w których odbicie mogłoby zakłócać dobrą widoczność.

#### Zastosowania wewnątrz:

- witryny muzealne i ekrany ochronne dla obrazów;
- gabloty sklepowe, sale wystawiennicze;
- ścianki działowe (szpitale, sterownie);
- studia telewizyjne i nagraniowe, kabiny tłumaczy;
- tablice sygnalizacyjne lub reklamowe (dworce, lotniska).

#### Zastosowania na zewnątrz:

- witryny sklepowe, przeszklone ściany w restauracjach;
- wieże kontrolne (lotniska, porty);
- szyby oddzielające kibiców na stadionach.

### ZALETY



#### Optymalna widoczność

Bardzo niskie odbicia resztkowe (dziesięciokrotnie niższe niż w przypadku zwykłego szkła) oraz znakomita przezierność szkła.



#### Odzworowanie barw

Wierne oddanie kolorów i kontrastu.



#### Bezpieczeństwo i izolacja akustyczna

Bezpieczne szkło laminowane STADIP PROTECT. Izolacja akustyczna dzięki zastosowaniu STADIP SILENCE.



#### Zwiększone właściwości termoizolacyjne

Szkło z powłoką niskoemisyjną.



## PARAMETRY

Produkt	Przepuszczalność światła	
	LT [%]	Odbicie światła LR [%]
DIAMANT, 8 mm	91	8
VISION-LITE STADIP PROTECT 44.2	96	1
VISION-LITE II, 8 mm	98	1

## ASORTYMENT

VISION-LITE jest dostępne na szkło DIAMANT:

- Semi VISION-LITE monolityczny o niskim współczynniku odbicia, powłoka tylko z jednej strony i szkło odprężone
- Semi VISION-LITE II monolityczny o niskim współczynniku odbicia, powłoka tylko z jednej strony i szkło hartowane
- STADIP VISION-LITE laminowany o niskim współczynniku odbicia, powłoka z obu stron i odprężone szkło
- STADIP VISION-LITE II monolityczny o niskim współczynniku odbicia, powłoka z obu stron i szkło hartowane



Produkt	Szkło bazowe	Grubość	Wymiar [cm]*
Semi VISION-LITE	DIAMANT	4, 6, 8, 10	6000 x 3210
Semi VISION-LITE II		4, 6, 8, 10	
STADIP VISION-LITE		44.2, 55.2, 64.2, 66.2, 88.2, 1010.2	
VISION-LITE II**		6, 8, 10	

\* Inne wymiary dostępne na zapytanie

\*\* Wymagane jest odcięcie 2cm od krawędzi

## PRZETWARZANIE I MONTAŻ

VISION-LITE jest szkłem powlekanym, którego obie powierzchnie zostały pokryte powłoką. Jego przetwarzanie i montaż muszą być zgodne z określonymi zaleceniami.

### Ważne informacje:

- Przy montażu w położeniu poziomym i wewnątrz pomieszczeń (gabloty muzealne, półki, stoły itd.) należy uważać, aby powłoka antyrefleksyjna nie była narażona na ślady palców lub zarysowania.
- Resztkowy współczynnik odbicia z dwoma niskorefleksyjnymi powłokami jest bardzo niski (1% refleksów).

Jednak w pewnych warunkach oświetlenia, otoczenia i kąta obserwacji, odbicie to staje się widoczne. Odbicie resztkowe zależy od kąta patrzenia.



  
**SAINT-GOBAIN**

[bgp@saint-gobain.com](mailto:bgp@saint-gobain.com)

[www.saint-gobain-building-glass.pl](http://www.saint-gobain-building-glass.pl)  
[www.glassolutions.pl](http://www.glassolutions.pl)

Opole, dnia 21.03.2019 r.

## POZWOLENIE 216/N/2019

*Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt.1, art. 37 a, art. 6 ust. 1 pkt 1 litera c, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),*

**po rozpatrzeniu wniosku:** Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina, **wpływ:** 15.03.2019 r., **w sprawie:** udzielenia pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac w Kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien siatek stalowych.

Kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rejestru **172/55** decyzją o wpisie z dnia 28.09.1955r.,

### **p o z w a l a m**

na prowadzenie robót budowlanych w Kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem typu Vision-Lite o niskim współczynniku odbicia oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien zabezpieczenia z siatki stalowej o dużej odporności na korozję, według projektu autorstwa mgr Jacka Gryczewskiego oraz mgr inż. Ryszarda Kubika z marca 2019 r.

**Warunki konserwatorskie:** na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków określa się warunki polegające na obowiązku:

- 1) kierowania robotami budowlanymi i sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 2) przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imion, nazwisk, adresów oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, a także oświadczenia

- ww. osób o przejęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac;
- 3) w przypadku zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w toku robót budowlanych, przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany, imion, nazwisk, adresów oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób;
  - 4) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
  - 5) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
  - 6) dokonania odbioru końcowego prac z udziałem OWKZ;

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do **31 grudnia 2020 r.**

*Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.*

#### Uzasadnienie:

W dniu 15.03.2019 r. do WUOZ wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina, w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych w Kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien siatek stalowych.

Kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie wpisany jest do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr **172/55** decyzją o wpisie z dnia 28.09.1955r.,

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Zgodnie z art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

Analiza załączonych dokumentów wykazała, iż w zakresie przedmiotowej inwestycji jest zabezpieczenie okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem typu Vision-Lite o niskim współczynniku odbicia oraz montaż w górnej, maswerkowej części okien zabezpieczenia z siatki stalowej o dużej odporności na korozję.

Dodatkowa osłona ze szkła o parametrach antyrefleksyjnych, zabezpieczy witraże przed szkodliwym działaniem czynników mechanicznych oraz atmosferycznych. Szkła zewnętrzne zapewnią barierę ochronną dla witraży przed osiadającymi nawarstwieniami z brudu, a także zabezpieczą przed szkodliwym działaniem silnych wiatrów. Montaż siatek stalowych o wysokiej odporności na korozję w górnej części okien, ochroni maswerki przed gołębiami.

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że przy zachowaniu w/w warunków konserwatorskich, przedmiotowa inwestycja może zostać zrealizowana. Zgodnie z treścią przytoczonego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

*Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.*

Zgodnie z art. 127a § 1 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.



OPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Erżbieta Molak

Pouczenie :

Inwestor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z cytowanego wyżej rozporządzenia, w szczególności:

1) Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.  
2) OWKZ wstrzymuje wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
- b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia OWKZ na prowadzenie wstrzymanych prac przy zabytku, albo
- c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin ich wykonania.

Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), OWKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.

3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), OWKZ wydaje decyzję:

- a) nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo ;
- b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób, w określonym terminie.

4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).

5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego).

6) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić OWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.

7) Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia (art. 107d ust. 1, 2, 5 ustawy).

8) Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, osoba która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37 c ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

9) Wnioskodawca winien przekazać Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi oraz sprawującej nadzór inwestorski, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac przez osobę;

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Parafia pw. Św. Jakuba St. Apostoła i Św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, na ręce pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego, ul. Zagrodowa 5, 48-340 Sidzina.

Do wiadomości:

1. Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole.
2. Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

aa.

## METRYKA OPRACOWANIA

### PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KONSERWATORSKIEGO OKIEN WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

Pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu nr 216/N/2019 z 21.03.2019 r.

Kategoria obiektu X

EGZ. 2/4

nazwa obiektu: <b>BAZYLIKA ŚW. JAKUBA ST. APOSTOŁA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE</b>		
temat: <b>PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KONSERWATORSKIEGO OKIEN WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA</b>		
lokalizacja: Bazylika św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie 48-300 Nysa, Pl. Katedralny 7		Nr ewid. działki: działka nr 6, ark. mapy 23
inwestor: Parafia przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie 48-300 Nysa, Pl. Katedralny 7		
zespół autorski	tytuł zawodowy, imię nazwisko, uprawnienia budowlane	podpis
ARCHITEKTURA	MGR INŻ.ARCH. ELŻBIETA KUBIK - MICHAŁSKA upr. bud. nr OKK/UpB/04/04	ELŻBIETA KUBIK - MICHAŁSKA mgr inż. architekt upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr. OKK/UpB/04/04
KONSTRUKCJA	INŻ. RYSZARD KUBIK upr. bud. nr: Op/133/84	RYSZARD KUBIK INŻYNIER BUDOWNICTWA upr. w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej do projektowania nr upr. 133/84/08

Glucholazy-Nysa sierpień 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE W NYSIE  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA  
Decyzję o pozwoleniu na budowę - ZMIANA PNB

wydał dn. 06.09.2019. Nr. 864/19  
z warunkami podanymi w decyzji  
z powyższym numerem

Z up. STAROSTY  
inż. Eugenia Kantorowicz  
Naczelnik Wydziału  
Architektury i Budownictwa



STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5000 85, fax 77 4085200

**SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA**

1.	Pozwolenie konserwatorskie	str. 3 - 5
2.	Plan sytuacyjny	str. 6
3.	Opis techniczny	str. 7 - 11
4.	Rysunek osłony szkłem Vision - Lite	str. 12
5.	Informacja BiOZ	str. 13 - 14
6.	Oświadczenie projektantów	str. 15
7.	Załącznik - Projekt zabezpieczenia szkieł witrażowych	16 - 20
8.	Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej projektantów	str. 21-22



Opolski  
Wojewódzki  
Konservator  
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl  
www.wuozopole.pl

2/3

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

ZN.5142.47.2019.KO

Opole, dnia 21.03.2019 r.

### POZWOLENIE 216/N/2019

*Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt.1, art. 37 a, art. 6 ust. 1 pkt 1 litera c, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),*

**po rozpatrzeniu wniosku:** Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina, **wplyw:** 15.03.2019 r., **w sprawie:** udzielenia pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac w Kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien siatek stalowych.

Kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rejestru 172/55 decyzją o wpisie z dnia 28.09.1955r.,

#### p o z w a l a m

na prowadzenie robót budowlanych w Kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem typu Vision-Lite o niskim współczynniku odbicia oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien zabezpieczenia z siatki stalowej o dużej odporności na korozję, według projektu autorstwa mgr Jacka Gryczewskiego oraz mgr inż. Ryszarda Kubika z marca 2019 r.

**Warunki konserwatorskie:** na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków określa się warunki polegające na obowiązku:

- 1) kierowania robotami budowlanymi i sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 2) przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imion, nazwisk, adresów oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, a także oświadczenia

3/4  
STAROSTWO POWIATOWE  
W NYSIE  
Wydział Inżynierii i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 4085208, fax 77 4085208

- ww. osób o przejęciu obowiązku kierowania robotami budowlanymi oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac;
- 3) w przypadku zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w toku robót budowlanych, przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, nie później niż w terminie 14 dni przed dokonaniem zmiany, imion, nazwisk, adresów oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób;
  - 4) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
  - 5) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
  - 6) dokonania odbioru końcowego prac z udziałem OWKZ;

Niniejsze pozwolenie posiada termin ważności do **31 grudnia 2020 r.**

*Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.*

Uzasadnienie:

W dniu 15.03.2019 r. do WUOZ wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina, w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych w Kościele pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien siatek stalowych.

Kościół pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie wpisany jest do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr **172/55** decyzją o wpisie z dnia 28.09.1955r.,

Podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Zgodnie z art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie oraz zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków.

Analiza załączonych dokumentów wykazała, iż w zakresie przedmiotowej inwestycji jest zabezpieczenie okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem typu Vision-Lite o niskim współczynniku odbicia oraz montaż w górnej, maswerkowej części okien zabezpieczenia z siatki stalowej o dużej odporności na korozję.

Dodatkowa osłona ze szkła o parametrach antyrefleksyjnych, zabezpieczy witraże przed szkodliwym działaniem czynników mechanicznych oraz atmosferycznych. Szkła zewnętrzne zapewnią barierę ochronną dla witraży przed osiadającymi nawarstwieńciami z brudu, a także zabezpieczą przed szkodliwym działaniem silnych wiatrów. Montaż siatek stalowych o wysokiej odporności na korozję w górnej części okien, ochroni maswerki przed gołębiami.

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że przy zachowaniu w/w warunków konserwatorskich, przedmiotowa inwestycja może zostać zrealizowana. Zgodnie z treścią przytoczonego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

*Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.*

Zgodnie z art. 127a § 1 W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208



OPOLSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTKÓW

*Eżbieta Molak*

**Pouczenie :**

Investor i wykonawca zobowiązani są do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac (robót, badań lub innych działań), wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z cytowanego wyżej rozporządzenia, w szczególności:

- 1) Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
- 2) OWKZ wstrzymuje wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prace przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a następnie wydaje decyzję:
  - a) nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności, albo
  - b) zobowiązującą do uzyskania pozwolenia OWKZ na prowadzenie wstrzymanych prac przy zabytku, albo
  - c) nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych prac przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin ich wykonania.
- Po wykonaniu obowiązku, o którym mowa pod lit. c), OWKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robót, badań lub innych działań) przy zabytku.
- 3) W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne działania), OWKZ wydaje decyzję:
  - a) nakazującą przywrócić zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo ;
  - b) zobowiązującą do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazywany sposób, w określonym terminie.
- 4) Osoba, która dopuściła się naruszenia przepisów o zabytkach lub naruszyła zakres i warunki określone w pozwoleniu, jest obowiązana na swój koszt wykonać czynności nakazane w decyzji, o której mowa w punkcie 2) lit. a) i c) oraz w punkcie 3).
- 5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy (w myśl przepisów Prawa budowlanego).
- 6) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić OWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w toku prac konserwatorskich przy zabytku, które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku. W takich przypadkach WKZ jest zobowiązany wydać wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia, może również wydane pozwolenie zmienić lub je cofnąć.
- 7) Kto bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, który wydał pozwolenie bądź był właściwy do wydania pozwolenia (art. 107d ust. 1, 2, 5 ustawy).
- 8) Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, osoba która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37 c ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
- 9) Wnioskodawca winien przekazać Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi oraz sprawującej nadzór inwestorski, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem prac przez osobę;

**Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)**

- 1. Parafia pw. Św. Jakuba St. Apostoła i Św. Agnieszki, Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa, na ręce pełnomocnika Pana Jacka Gryczewskiego, ul. Zagrodowa 5, 48-340 Sidzina.

**Do wiadomości:**

- 1. Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole.
- 2. Starostwo Powiatowe w Nysie, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.

aa.


STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

# PLAN SYTUACYJNY

BAZYLIKA pw. św. Jakuba i św. Agnieszki

Nysa Plac Katedralny 7

1 : 1000

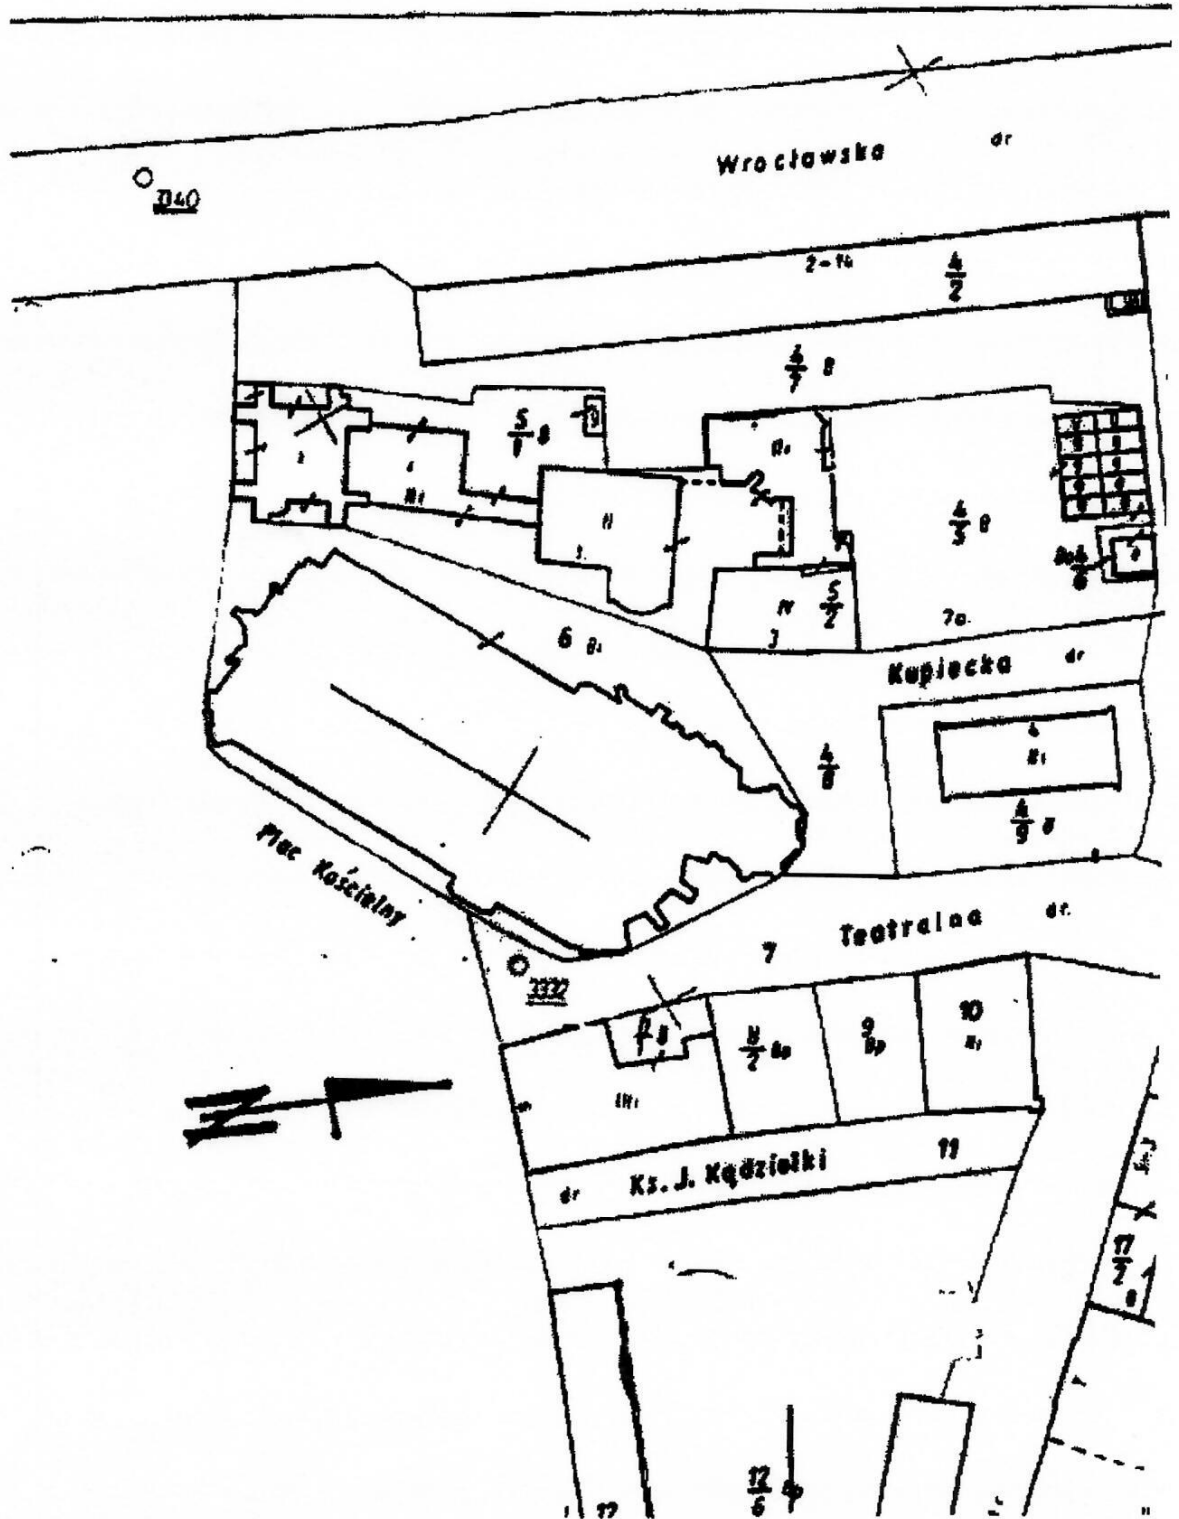

## OPIS TECHNICZNY

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- 1.1. Pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu nr 216/N/2019 z 21 marca 2019r.
- 1.2. Obowiązujące przepisy architektoniczno-budowlane.
- 1.3. Polskie normy z zakresu wymiarowania konstrukcji:
- 1.4. Programy obliczeniowe:
  - RM\_Win 11.83 CadSIS  
(obliczenia statyczne - znajdują się w egzemplarzu archiwalnym autora opracowania).

BIURO ARCHITECTURY I BUDOWNICTWA  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

### 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykazanie robót związanych z zabezpieczeniem okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym, zewnętrznym szkłem typu Vision-Lite o niskim współczynniku odbicia oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien zabezpieczenia z siatki stalowej o dużej odporności na korozję.

### 3. OPIS OBIEKTU:

Bazylika św. Jakuba jest obiektem halowym, dziewięcioprzęsłowy, o trzech nawach, prawie równej wysokości, orientowany, zbudowany z jasnoszarego piaskowca i różowej cegły. Na zewnątrz budynek świątyni opięty jest uskokowymi przyporami, między które wbudowane zostały w XV i XVI wieku niskie kaplice. Powyżej znajdują się duże okna ostrołukowe z maswerkami. Szczyt zachodni (w górnej części zrekonstruowany w 1957 roku), podzielony jest dwoma przyporami i lizenami z ostrołukowymi blendami. Kościół nakryty został dachem dwuspadowym z wieżyczką sygnatorkową na kalenicy. Nawa główna, stara zakrystia, boczne kaplice i kruchty nakryte są sklepieniem krzyżowo-żebrowym, chór muzyczny – gwiaździsto-sieciowym, ambit – trójdzielnopreskokowym, a baptysterium – kopulastym z sześcioboczną latarnią. W sklepieniach naw bocznych widoczne są zworniki w kształcie ludzkich głów. Nawa główna przechodzi w niewyodrębnione, zamknięte trójbocznie prezbiterium. Nawy boczne tworzą od wschodu sześcioboczne, zamknięte obejście.

Od północy do prezbiterium przylega zamknięta trójbocznie stara zakrystia, a od północnego wschodu dobudowane jest ośmioboczne baptysterium. Główny korpus budynku otoczony jest przez wieniec 16 gotyckich kaplic. Przy ósmym przęśle, od południa i północy, w miejscu dawnych wejść, urządzono dwie dodatkowe kaplice barokowe. W kościele znajdują się 24 potężne filary. Każdy z nich jest podzielony przez 12 kamiennych opasek, pomiędzy którymi znajduje się po 12 warstw cegieł. Ta symbolika architektoniczna odnosi się m.in. do patrona – św. Jakuba Starszego, jednego z dwunastu apostołów. Do korpusu od zachodu dostawiona jest zamknięta dwubocznie, neogotycka kruchta o szerokości nawy głównej, wykonana z wapienia francuskiego i jasnego piaskowca. Na osi trzeciego przęśla korpusu dobudowano dwie symetryczne kruchty od południa i północy. Na zewnątrz kościoła, w jego południowo-zachodnim narożniku zachowała się grupa ukrzyżowania z 1729 roku. Z powodu licznych modernizacji kościół wydaje się być obecnie budowlą jednolitą, jednak część zachodnia różni się od wschodniej kształtem obramowań okien oraz inną budową wspomników

sklepień. Kaplice boczne w części wschodniej zostały wstawione wtórnie między skarpy, natomiast w części zachodniej kaplice były wznoszone równolegle z murami kościoła.

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85. fax 77 4085208

#### 4. DANE O REJESTRZE ZABYTKÓW

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 172/55 z dnia 28 listopada 1955 r. Wszelkie prace przy obiekcie wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

#### 5. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYM I PRZEWDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

Istniejące zagrożenia dla środowiska: nie występują.

Na podstawie posiadanych danych przyrodniczych, mając na uwadze skalę, zasięg oddziaływania i charakter inwestycji oraz miejsce jej realizacji, nie przewiduje się, aby działania realizowane w ramach projektu mogły istotnie oddziaływać na jakość i stan siedlisk oraz gatunków, dla ochrony których wyznaczono i wytypowano obszar Natura 2000 w województwie opolskim, a także na spójność tych obszarów.

Ze względu na zakres prac i niewielką ich skalę oraz brak ingerencji w środowisko gruntowo – wodne ww. projekt nie będzie wpływał na elementy biologiczne, hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne oraz fizykochemiczne wspierające elementy biologiczne jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Biorąc pod uwagę powyższe, wykonanie wykazanych robót związanych z witrażami bazyliki nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

#### 6. OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Roboty budowlane i ich zakres jest zgodny z wolą inwestora i zarządcy obiektu.

#### 7. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Bazylika jest obiektem halowym, dziewięcioprzęsłowy, o trzech nawach, prawie równej wysokości, orientowany, zbudowany z jasnoszarego piaskowca i różowej cegły, częściowo podpiwniczony z poddaszem - strychem. Wzniesiony w gotyku, w I połowie XV wieku – wielokrotnie remontowany.

Teren nieogrodzony, uzbrojony w sieć wodociagową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazową, energetyczną i teletechniczną.

- Pow. użytkowa: ok. 1.900 m<sup>2</sup>
- Kubatura: 35.700 m<sup>3</sup>
- Wysokość budynku: ok. 70,00 m (do kalenicy 53,70 m)
- Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
- Ilość klatek schodowych: 2
- Podpiwniczenie: częściowe

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5030, fax: 77 4085208

## 8. KONSTRUKCJA BUDYNKU

- Mury fundamentowe z kamienia łamanego z ułkami cegieł na zaprawie wapienno - piaskowej;
- Ściany nadziemne z cegły palonej oraz kamienia na zaprawie wapienno -piaskowej;
- W obiekcie wieloprzęsłowe sklepienia o różnej konstrukcji, oparte na wielobocznych filarach.
- Konstrukcja dachu stalowa, pokrycie z dachówki ceramicznej.

## 9. WNIOSKI I ZALECENIA

Podczas realizacji prac w obiekcie oraz podczas jego późniejszej eksploatacji należy przestrzegać następujących wymogów:

- Podczas prowadzenia prac należy na bieżąco sprawdzać wymiary szklonych kwater.
- Nad wszystkimi robotami budowlanymi powinien być prowadzony stały nadzór jakościowy.
- Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania na terenie Polski.
- Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszą być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich i mające udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji. Prace winien prowadzić uprawniony kierownik robót, posiadający udokumentowane doświadczenie w pracach przy zabytkach nieruchomych.
- Nie dopuszcza się do wprowadzenia w trakcie prac jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody autora projektu.
- Wszelkie zmiany i wątpliwości konsultować z nadzorem autorskim.
- Przed rozpoczęciem prac powiadomić przedstawiciela zespołu projektowego.
- Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

## 10. EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Teren położony poza granicami terenu eksploatacji górniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym, oraz nie wymaga określenia kategorii przydatności terenu do zabudowy.

## 11. OPIS WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH

W wyniku dociążenia szkłem w minimalnym stopniu zwiększają się oddziaływania na konstrukcję obiektu. Budowla jest stabilna, nie wykazuje odkształceń, nie wykonywano analizy spowodowanej wstawieniem szkła ochronnego.

## 12. ZAKRES OPRACOWANIA:

Proponowany zakres prac przedstawiono w projekcie zabezpieczenia szkielec witrażowych.

Projekt jest uzupełnieniem do prowadzonych prac konserwatorskich. W wyniku prac dodatkowa osłona witraży zabezpieczy je przed działaniem czynników mechanicznych i chemicznych co ograniczy w przyszłości korozję

szkieł witrażowych. Obecne zabezpieczenia w górnej części okien z siatki o złym stanie technicznym zostanie wymienione na nowe o zwiększonej odporności na korozję.

Sposób montażu szyb ochronnych pokazano na rysunkach wg załączonego do niniejszego opracowania „Projektu Zabezpieczenia Szkieł Witrażowych” autorstwa Jacka Gryczewskiego i Ryszarda Kubika z marca 2019 r., na podstawie którego uzyskano pozwolenie konserwatorskie.

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

### 13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

#### 13.1. Charakterystyka budynku.

- Pow. użytkowa: ok. 1.900 m<sup>2</sup>
- Kubatura: 35.700 m<sup>3</sup>
- Wysokość budynku: do kalenicy 53,70 m

#### 13.2. Odległość między budynkami.

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na terenie zabudowy miejskiej. Budynek usytuowany 9,0 m od najbliższego obiektu.

#### 13.3. Parametry występujących substancji palnych.

Pomieszczenia stwarzają minimalne zagrożenie pożarowe dla tego typu obiektów. Wpływ mają tutaj ogólne wyposażenia użytkowe. Zagrożenie pożarowe może także pochodzić od instalacji i urządzeń zasilających energią elektryczną – zwarcia i przeciążenia instalacji elektrycznej, niewłaściwej eksploatacji, braku nadzoru i konserwacji w/w urządzeń.

#### 13.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób.

Zgodnie z założoną funkcją, wg §209 ust. 2 „warunków technicznych” obiekt kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

#### 13.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W przedmiotowym budynku nie występuje zagrożenie wybuchem.

#### 13.6. Warunki ewakuacji.

Istniejące drogi ewakuacyjne do drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku.

#### 13.7. Drogi pożarowe

Do budynku zapewniono drogę pożarową umożliwiającą przejazd bez konieczności cofania.

Wokół budynku zlokalizowane są place manewrowe o wymiarach ponad 50 x 50 m.

## 14. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Ze względu na specyfikę obiektu obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki o nr ewidencyjnym gruntu 6, położonej w m. Nysa, Pl. Katedralny nr 7.

Planowane roboty nie wychodzą poza obrys ścian zewnętrznych istniejącego obiektu, a obszar oddziaływania nie wykracza poza w/w teren.

STAROSTWO POWIATOWE  
W NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

## 15. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

Szyby zabezpieczają witraże od parcia wiatru jak uderzenia ptaków, zapewniając optymalną widoczność, poprawiają izolacyjność akustyczną jak również zwiększają właściwości termoizolacyjne.

## 16. WNIOSKI I ZALECENIA.

Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

Materiały wbudowane muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne i odpowiadać normom.

## 17. UWAGI KOŃCOWE.

Nie dopuszcza się zastosowania materiałów innych od wskazanych w niniejszym opracowaniu.

Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie sugerowane zmiany uzgadniać przed ich wprowadzeniem z autorem projektu.

## 18. NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Roboty mogą być wykonane tylko wykwalifikowani pracownicy.

**Prace prowadzić pod nadzorem autorskim i architektoniczno - konserwatorskim.**

**W przypadku pojawienia się nieścisłości lub pytań należy bezwzględnie skontaktować się z autorami opracowania.**

## ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE

Autorzy opracowania nie mogą odpowiadać za wady ukryte, których nie można było stwierdzić w czasie wizji lokalnych. O okolicznościach, jakie mogą zaistnieć w przyszłości, a które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania obiektu należy powiadomić autorów niniejszego opracowania.

ELŻBIETA KUBIK MICHAŁSKA  
mgr inż. architekt  
upr. bud. w spec. architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr OKK/02B/04/04



RYSZARD KUBIK  
INŻYNIER BUDOWNICTWA  
upr. w specjalności architektonicznej  
i konstrukcyjno - budowlanej do projektowania  
nr upr. 133/04/0p

sierpień 2019 r.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-100 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 50 00-65, fax 77 408 52 00

OKNO WITRAŻOWE - PRZEKRÓJ  
ZABEZPIECZENIE SZKŁEM  
OD ZEWNĄTRZ

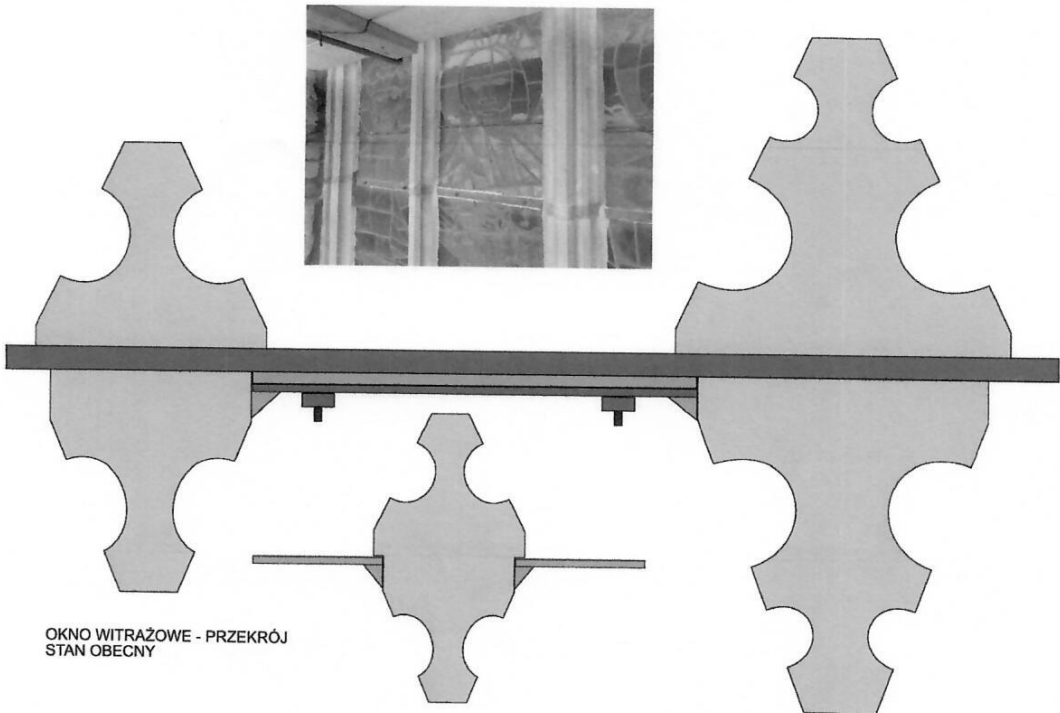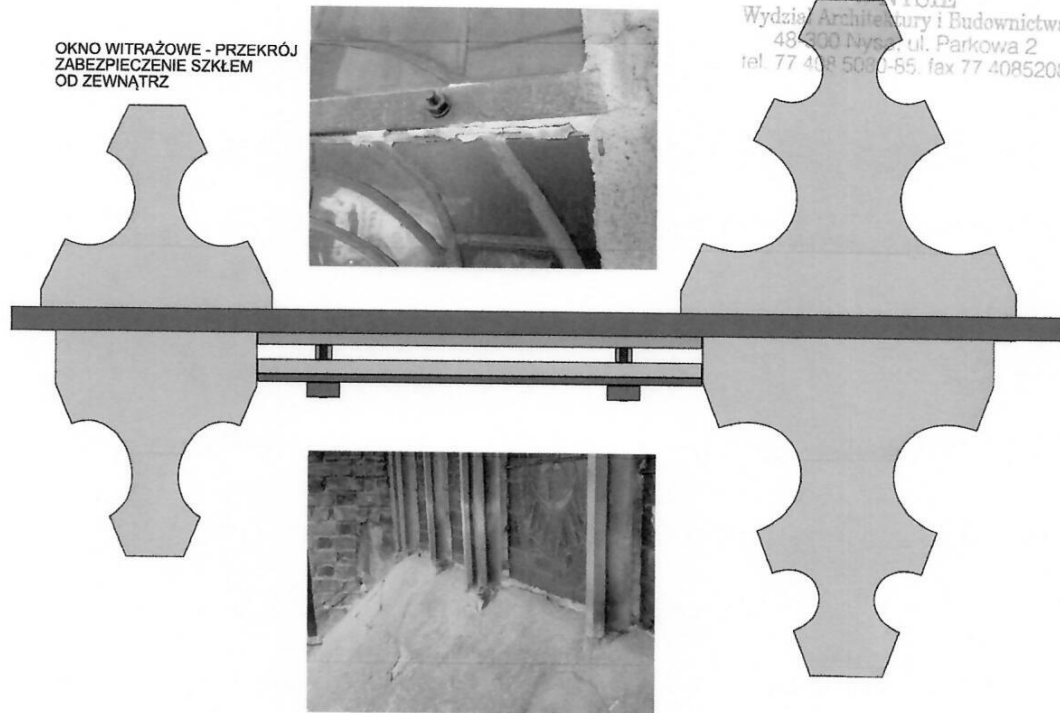

OKNO WITRAŻOWE - PRZEKRÓJ  
STAN OBECNY

STANISŁAW ŚWIĄTOŃ  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85 fax 77 4085208

## KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X

### INFORMACJA DOT.BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI WYKONANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA PODDASZU BAZYLIKI.
2. OBIEKT: Bazylika Św. Jakuba St. Apostoła i Św. Agnieszki w Nysie
3. LOKALIZACJA: 48-300 Nysa. Pl. Katedralny 7
4. INWESTOR: Parafia przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie, 48-300 Nysa, Pl. Katedralny 7
5. PROJEKTANT: Ryszard Kubik

### CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projekt prac jest uzupełnieniem do prowadzonych robót konserwatorskich przy trzech oknach witrażowych z zachodniej elewacji.

#### 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH:

Przedmiotem niniejszego opracowania są prace w obiekcie stanowiącym element zabudowy luźnej.

#### 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie występują zagrożenia.

#### 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT:

Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

- o zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości,
- o zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem elementami w trakcie prac,
- o zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

Część podanych zagrożeń występuje łącznie.

Projektowane prace nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Obiekt wraz z projektowanym wyposażeniem oraz o przewidywanym sposobie użytkowania nie będzie emitował szczególnych hałasów i wibracji wymagających środków zaradczych. Ten stan nie zmienia się w stosunku do dotychczasowego jego użytkowania. Emisja zanieczyszczeń nie będzie większa niż dopuszczana w aktualnych przepisach i normach.

## 5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH;

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:

- o określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- o poinformować o obowiązku stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- o określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na terenie budowy.

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 50 00

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pisemnie, że zostali do tych robót odpowiednio przygotowani.

## 6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH;

- 6.1. W czasie prowadzenia robót przebywanie ludzi w strefie zagrożenia jest zabronione. Obszar na zewnątrz obiektu, na którym będą prowadzone roboty należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od obiektu, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0 m. Roboty na rusztowaniu należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/sek.
- 6.2. Roboty remontowo budowlano – mogą wystąpić następujące zagrożenia :
  - o Upadek pracownika przy braku zabezpieczeń
  - o Potrącenie lub przygniecenie pracownika przy braku zabezpieczeń
  - o Skaleczenie podczas niewłaściwego używania narzędzi
  - o Zagrożenia mogą wystąpić w miejscu i w czasie prowadzenia robót.
- 6.3. Roboty z użyciem narzędzi elektrochemicznych (zagrożenie porażenia prądem)- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

## 7. UWAGI KOŃCOWE

Uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, występują przypadki określone w art.21a Prawa budowlanego, w związku z czym jest wymagane sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

- Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.
- Prace prowadzić zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
- W wypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień bezzwłocznie należy skontaktować się z autorem opracowania.

RYSZARD KUBIK  
INŻYNIER BUDOWNICTWA  
upr. w specjalności architektonicznej  
i konstrukcyjno-budowlanej do projektowania  
nr upr. 133640p

sierpień 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208

### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Niniejszym oświadczamy, że opracowanie pt. **PROJEKT ZABEZPIECZENIA SZKIELEC WITRAŻOWYCH Z OKIEN ZACHODNICH Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie** opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

ELŻBIETA KUBIK MICHALSKA  
mgr inż. architekt  
upr. bud. w spec. architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń  
nr OKK/OpE/04/14

mgr inż. Arch. Elżbieta Kubik Michalska

RYSZARD KUBIK  
INŻYNIER BUDOWNICTWA  
upr. w specjalności architektonicznej  
i konstrukcyjno-budowlanej do projektowania  
nr upr. 133/84/Op

inż. Ryszard Kubik

2/16

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5090-65, fax 77 4085208

**PROJEKT ZABEZPIECZENIA SZKIEŁ WITRAŻOWYCH**

OSTATNI ETAP REMONTU KONSERWATORSKIEGO OKIEN WITRAŻOWYCH Z ELEWACJI  
ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA I ŚW. AGNIESZKI W NYSIE

OPRACOWANIE:  
Jacek Gryczewski, dyplomowany konserwator zabytków  
ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina  
Ryszard Kubik, konstruktor  
ul. Królowej Jadwigi 18, 48-340 Głuchołazy

Nysa, 10.03.2019




o. Mikołaj Miś  
proboszcz



okien istnieją zabezpieczenia wykonane z siatek. Zostaną one wymienione na podobne, wykonane z nowszych materiałów. Siatki zabezpieczają okna przede wszystkim przed gołębiami.

## **WSKAZANIE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA (METODY, MATERIAŁY I TECHNIKI)**

W górnej, maswerkowej części okien należy zdemontować istniejące siatki stalowe (fot. 1). W ich miejsce zamontować siatki nowe, o zwiększonej odporności na korozję.

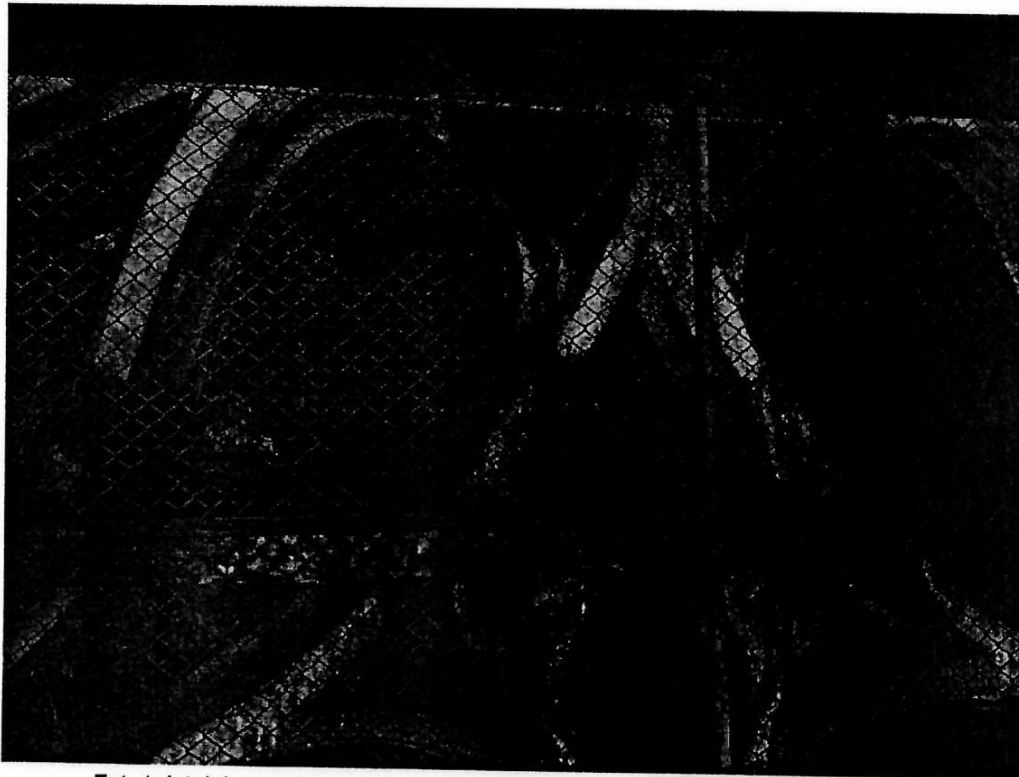


Fot. 1. Istniejące zabezpieczenie z siatek - okno witrażowe z elewacji zachodniej

W obszarach szklonych kwaterami prostokątnymi, do górnej krawędzi laskowań zostaną zamontowane szyby ochronne. Sposób montażu pokazano na rysunkach 1 i 2. Do szklenia zostanie wykorzystane szkło Vision - Lite o niskim współczynniku odbicia (załącznik 1).

## OPIS OBIEKTU

Projekt prac jest uzupełnieniem do rozpoczętych prac konserwatorskich przy trzech oknach witrażowych z zachodniej elewacji kościoła pw. Św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Autorem projektu okien jest Adam Stalony-Dobrzański.

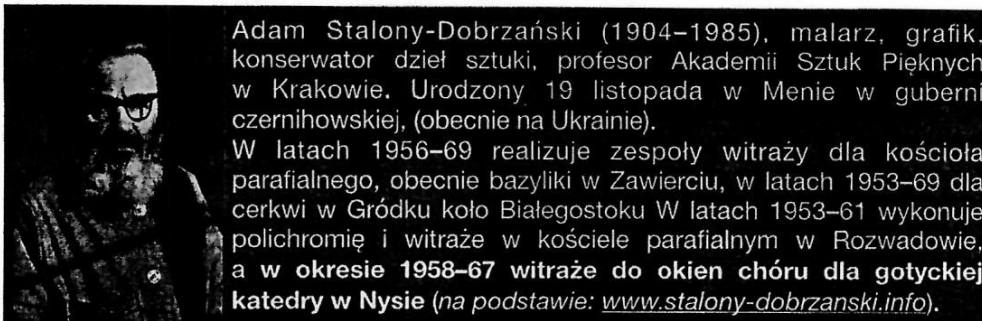

Okna powstały w latach 1958-1967.

## STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Stan zachowania szkiele, elementów stalowych i kamiennych maswerków tworzących całość jest bardzo zła. Elementy kamienne nie są jednak przedmiotem obecnego opracowania.



Stwierdzono występowanie znacznych odkształceń płaszczyzn pól witrażowych spowodowane czynnikami mechanicznymi (np. naporem wiatru, być może uderzeniami ptaków).

W wielu miejscach zaobserwowano rozkruszenie miejsc lutowanych, pęknięcia taśm ołowianych oraz duże ubytki w kicie. Ponadto całość, szczególnie od strony zewnętrznej, jest pokryta brudem. Można zauważyć liczne plamy ptasich odchodów. Elementy stalowe (wiatrowniki, płaskowniki) pokryte są nawarstwieniami korozyjnymi.

W otoczeniu okien witrażowych prowadzone są prace budowlano-konserwatorskie. Na prace konserwatorskie przy szklach witrażowych zostało wydane pozwolenie nr 1186/N/2018 z dnia 21.12.2018.



## OCZEKIWANE EFEKTY PRAC

Znacznej poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Dodatkowa osłona ze szkła zabezpieczy okna przed działaniem czynników mechanicznych oraz chemicznych. Brud nie będzie osadzać się bezpośrednio na elementach zabytkowych, co ograniczy w przyszłości korozję szkła. Zabezpieczenie szkłem ochronnym poprawi odporność na wiatr iW górnej, maswerkowej części

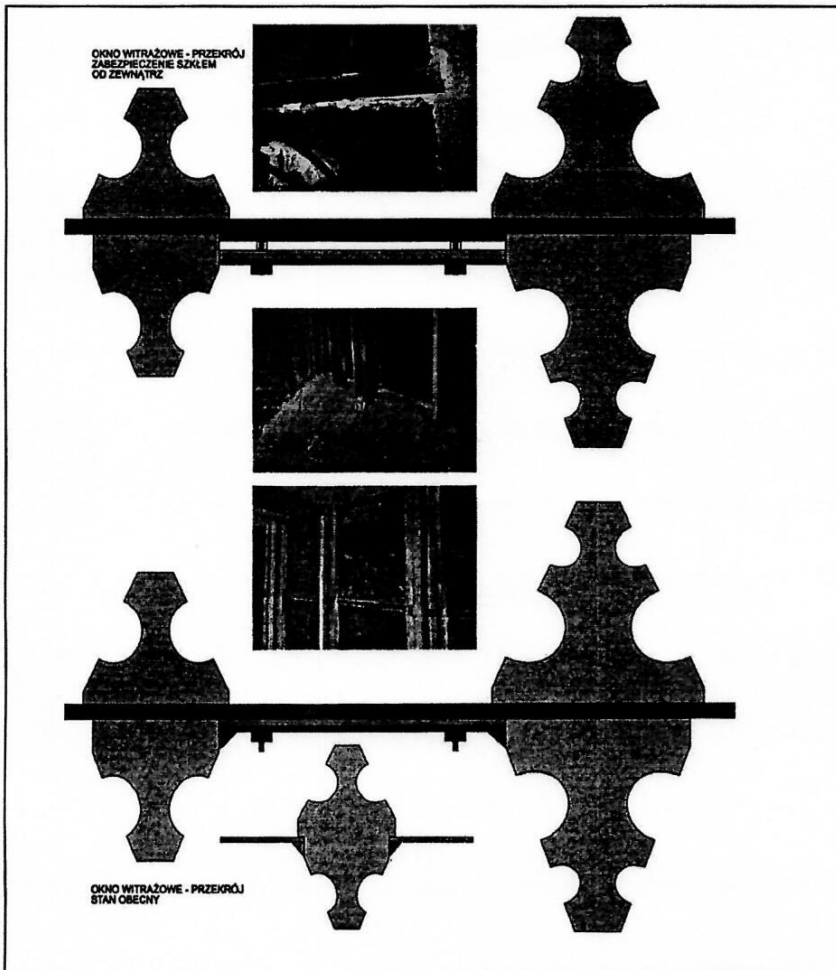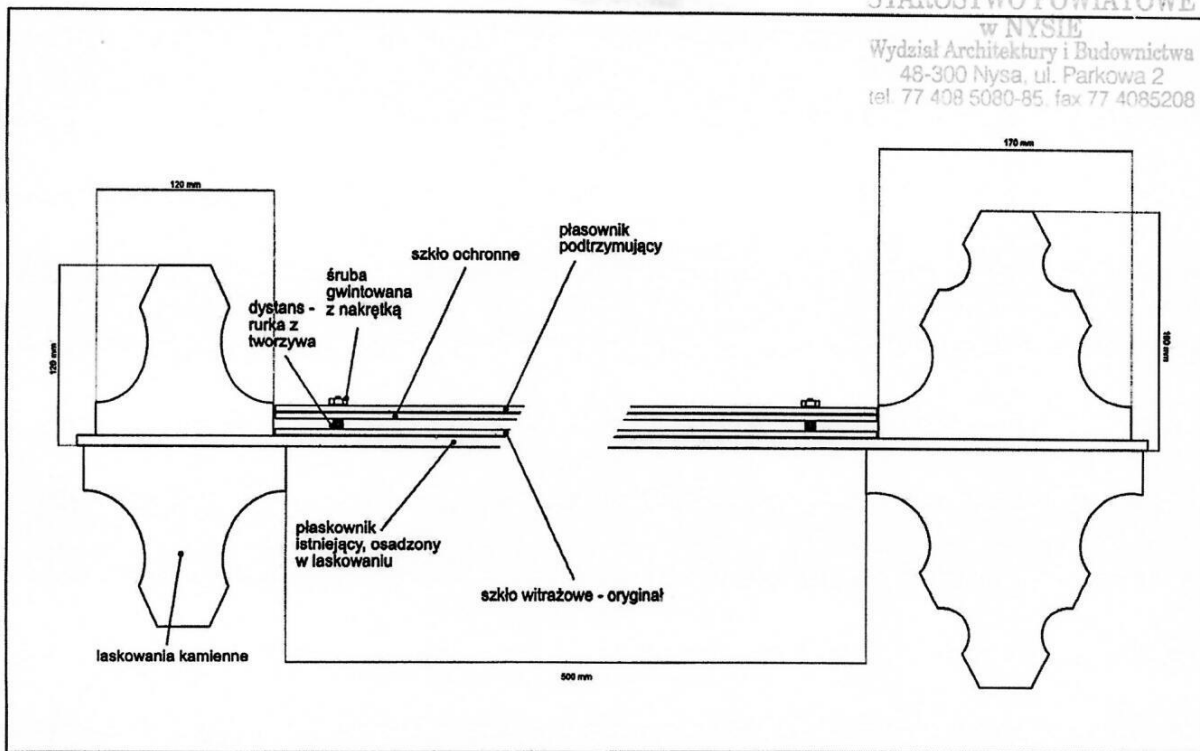

Rysunek 01  
Sposób montażu  
ochronnego szkła  
- przekrój poziomy

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5090-95, fax 77 4085206

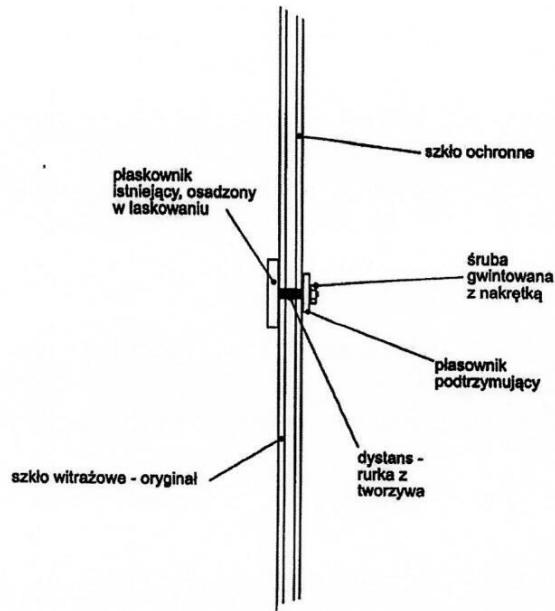

Rysunek 02

Sposób montażu  
ochronnego szkła  
- przekrój pionowy



**IZBA ARCHITEKTÓW  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

**ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ**  
(wypis z listy architektów)

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

**magister inżynier architekt Elżbieta Izabela Kubik-Michalska**

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **OKK/UpB/04/04**, jest wpisana na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **OP-0120**.

Członek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 26-06-2019 r. Opole.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-10-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:  
Jakub Tomiczek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:


**OP-0120-76AA-543E-C77Y-E871**

---

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: [www.izbaarchitektow.pl](http://www.izbaarchitektow.pl) lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

2/22

STAROSTWO POWIATOWE  
w NYSIE  
Wydział Architektury i Budownictwa  
48-300 Nysa, ul. Parkowa 2  
tel. 77 408 5080-85, fax 77 4085208



P O L S K A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

**Zaświadczenie**  
o numerze weryfikacyjnym:  
**OPL-KQ4-RUS-URG \***

Pan RYSZARD KUBIK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1387/01  
adres zamieszkania ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 18, 48-340 GŁUCHOŁAZY  
jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczący Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

**DECYZJA nr 864 / 19**

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. ) oraz art. 104 i art. 163 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) na wniosek

**Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki**  
zs. w 48-300 Nysa, Plac Katedralny 7

**z 4 września 2019 r.**

w sprawie zmiany warunków decyzji nr **48 / 13 z 25 stycznia 2013 r.** ( znak sprawy AB.6740.26.2013.EK )

**zmieniam decyzje**

nr **48 / 13 z 25 stycznia 2013 r.** ( znak sprawy AB.6740.26.2013.EK ) wydaną przez Starostę Nyskiego na rzecz **Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie**, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na remoncie dachów bazyliki i kaplic bocznych oraz elewacji i sklepień naw Bazyliki pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie, Plac Katedralny 7 ( działka nr 6 )

**w części dotyczącej projektu budowlanego, w następujący sposób :**

- **wprowadzam i zatwierdzam dodatkowy projekt budowlany, obejmujący wykonanie robót budowlanych w bazylice pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie wpisanej do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 172/55, polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji dodatkowym zewnętrznym szkłem oraz montażu w górnej części okien zabezpieczenia z siatki,**
- **udzielam pozwolenia na wykonanie ww. robót - zgodnie z treścią wprowadzonego projektu budowlanego**

**autorzy wprowadzonego projektu :**

**architektura - mgr inż. arch. Elżbieta Kubik - Michalska** ( uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr OKK / UpB / 04 / 04, wpis na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Architektów nr OP-0120 )

**konstrukcja - inż. Ryszard Kubik** ( uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 133 / 84 / Op, wpis na listę członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ewid. OPL / BO / 1387 / 01 )

**Pozostałe warunki wyżej wymienionej decyzji nr 48 / 13 z 25 stycznia 2013 r.** ( znak sprawy AB.6740.26.2013.EK ) **pozostają bez zmian.**

**UZASADNIENIE**

4 września 2019 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie wystąpił do tutejszego organu z wnioskiem o zmianę warunków pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na remoncie dachów bazyliki i kaplic bocznych oraz elewacji i sklepień naw Bazyliki pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie, Plac Katedralny 7 ( działka nr 6 ).

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dołączono oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz cztery egzemplarze projektu budowlanego przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Bazylika pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie wpisana jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr rej. 172/55, dla wnioskowanych robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu okien witrażowych z zachodniej elewacji kościoła dodatkowym zewnętrznym szkłem typu Vision-Lite o niskim współczynniku odbicia oraz montażu w górnej, maswerkowej części okien zabezpieczenia z siatki stalowej o dużej odporności na korozję. Inwestor uzyskał pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 216 / N / 2019 z 21 marca 2019 r. ( znak sprawy ZN.5142.47.2019.KO ).

Zgodnie z informacją o obszarze oddziaływania obiektu sporządzoną przez projektanta i zawartą w projekcie budowlanym ( wymaganą w myśl przepisów art. 34 ust. 3 pkt. 5 ww. ustawy Prawo budowlane ) - obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się w granicy działki objętej terenem inwestycji tj. działki nr 6 ark.m. 23 obręb ewidencyjny Śródmieście, jednostka ewidencyjna Nysa - miasto. W trakcie postępowania toczącego się przed tutejszym organem ustalono, iż obszar ten został określony prawidłowo.

Wobec spełnienia przez Inwestora wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 ww. ustawy Prawo budowlane orzekłem jak sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja z decyzją przywołaną jak wyżej oraz załącznikami do tych decyzji stanowi integralną całość.


**Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał niniejszą decyzję.**

**Z dniem doręczenia organowi, który wydał niniejszą decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPLATY SKARBOWEJ :

Zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej  
( jednolity tekst; Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 )



Z up. STAROSTY  
inż. Eugenia Kantorowicz  
Naczelnik oddziału  
Architektury i Budownictwa

**Otrzymują (strony postępowania) :**

- 1.) Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie + 2 zał.
2. a/a + zał.

**Do wiadomości:**

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Nysa, ul. Parkowa 2 + zał.

**Klauzula informacyjna:**

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatów niniejszego pisma podane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:  
<http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,20311.html>
